UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA

CORSO DI SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN

PROF. A.R. FASOLINO - A.A. 2026-27



DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO DI SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN

PICUS PROGRAMMA INTEGRATIVO CONTRO URGENZE SOCIALI

Versione 0.5 | 25 ottobre 2026 | Preparazione

INDICE

A1 VISIONE PERIMETRO E GLOSSARIO 1
Glossario iniziale 1
A2 STAKEHOLDER E CONTESTO 2
Context Diagram CTX 01 3
A3 PROCESSO ATTUALE E PROCESSO PROPOSTO 4
Processo attuale AS IS 4
ASIS 01A Richieste e appuntamenti 5
ASIS 01B Rendicontazione trimestrale 6
Criticità del processo attuale 7
Processo proposto TO BE 7
TOBE 01A Richiesta e disponibilità 8
TOBE 01B Appuntamento e chiusura 9
TOBE 02 Rendicontazione trimestrale 10
Miglioramenti e criteri di riscontro 11
Ciclo di vita delle richieste 11
A4 EPIC BACKLOG E USER STORY 12
Registro delle Epic 12
Fotografia e proposta del backlog 12
Schede dettagliate delle storie 14
Storie candidate catalogo e offerta 22
Storie candidate coordinamento delle richieste 23
Storie candidate comunicazioni 24
Storie candidate rendicontazione 25
Valutazione INVEST ed esito del raffinamento 26
A5 DATI E SCENARI DI QUALITÀ 27
Requisiti sui dati 27
Catalogo degli scenari di qualità 28
QS-01 Isolamento degli accessi 29
QS-02 Minimizzazione e riservatezza dei dati 30
QS-03 Risposta durante i picchi trimestrali 31
QS-04 Uso dei flussi principali da smartphone 32
QS-05 Ripristino del servizio dopo un fermo 33
QS-06 Modifica del catalogo senza rilascio software 34
A6 DOMANDE APERTE E IPOTESI 35
Risposte parziali e validazioni residue 38
Registro delle ipotesi provvisorie 39
A7 PROPOSTA DI MVP 40
Sette tagli funzionali proposti 40
Prerequisiti ed esclusioni 41
Dimostrazione e criteri di riuscita 42
A8 ARCHITETTURA E DECISIONI TECNICHE 43
Stack adottato 43
Responsabilità MVC 43
Confini modulari e qualità 44
GRASP e pattern GoF 44
Viste e contratti da introdurre 44
Scheda riutilizzabile di Architecture Decision Record 45
Registro delle decisioni da mantenere 45
A9 INCREMENTI VERIFICHE ED ESECUZIONE 46
Registro degli incrementi 46
Strategia di verifica adottata 46
Scheda riutilizzabile della verifica 46
Istruzioni riproducibili e deployment 47
Coerenza tra prodotto e documentazione 47

B1 TEAM E COLLABORAZIONE 48
B2 CALENDARIO E CRITERI DI COMPLETAMENTO 50
C1 REGISTRO DELLA PREPARAZIONE 52
C2 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 1 55
C3 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 2 56
C4 REGISTRO DELLA COSTRUZIONE 3 57
D1 TRACCIABILITÀ E DIAGRAMMI 58
D2 FONTI E RIFERIMENTI 60

USO DEL DOCUMENTO

Questo documento raccoglie il contesto PICUS, i vincoli espliciti delle fonti, le scelte tecniche adottate dal gruppo e le schede con cui mantenere analisi ed evidenze durante le iterazioni. Nella preparazione serve a costruire una proposta verificabile di prodotto; nelle iterazioni di costruzione viene aggiornato insieme al software.

La parte A descrive il prodotto corrente. La parte B raccoglie organizzazione e criteri comuni. La parte C conserva una fotografia datata di ogni iterazione. Le appendici collegano fonti, requisiti, decisioni e verifiche. I capitoli si aggiornano in parallelo: non rappresentano fasi da chiudere una volta per tutte.

Stato delle informazioni

Stato	Significato e uso
Fonte	Informazione esplicitamente presente nei desiderata o nel piano del corso; citare documento e sezione.
Decisione del team	Scelta tecnica o organizzativa adottata; indicare motivazione, data ed eventuale ADR.
Proposta	Requisito o miglioramento da discutere; non equivale a conferma del committente.
Ipotesi	Assunzione temporanea con impatto, dipendenze e criterio per riesaminarla.
Da compilare o verificare	Campo o artefatto ancora da produrre, revisionare o validare; non è lavoro completato.

Il completamento di una task di analisi non attesta l'implementazione della User Story. Esiti di test, feedback e approvazioni si registrano soltanto quando disponibili.

Registro delle modifiche

Versione e data	Modifica	Riferimenti
0.2 18/10/2026	Adattamento del modello a PICUS e struttura per prodotto e iterazioni.	F01–F05; preparazione
0.3 25/10/2026	Allineamento di contesto, fonti, ruoli, CSV opzionale, CTX-01 e PDF.	Correzioni del 21/10; F06–F07
0.4 25/10/2026	Compilate A1–A4, ASIS-01A/B, catalogo delle storie e INVEST.	F02, F06–F08
0.5 25/10/2026	To-be, sei QS, chiarimenti, MVP, piano S1 e scaletta review.	A3–A7, C1, D1–D2; proposta aperta in #29

Redazione e revisione Il gruppo concorda chi integra il Word o come usare il coauthoring; registrare il revisore dei singoli artefatti. Conservare una copia datata della versione presentata a ogni review.

A1 Visione perimetro e glossario

PICUS supporta il Banco nel coordinamento delle Organizzazioni Partner Territoriali, delle misure di accompagnamento e degli erogatori. Gli appunti del 20/10 aggiornano il contesto a 400–450 OPT distribuite in circa 200 comuni; F02 indicava circa 200 OPT. Il dato «230.000 utenti» resta da chiarire per significato e periodo: non definisce assistiti, account o accessi contemporanei. [F02, §§2–3 e 6; F06, 20/10]

Product Goal proposto Rendere tracciabile il coordinamento fra Banco, OPT ed erogatori, dalla richiesta all'esito, e raccogliere informazioni e schede senza ricostruirle da comunicazioni separate. La formulazione è proposta al PO, non deliberata nel planning.

Perimetro del prodotto Account e accessi; catalogo; offerta e disponibilità; richieste e appuntamenti; comunicazioni; schede trimestrali e rendicontazione. Le cinque Epic e le storie sono in A4; la selezione dell'MVP resta da motivare in A7. [F02 §§4–5; F06; F07]

Confini e responsabilità Nessun account o dato identificativo degli assistiti in PICUS. La OPT mantiene il contatto con le persone; gli scambi fra OPT passano dal Banco. Erogazione e gestione del personale interno OPT restano esterne. Il Banco inserisce manualmente i dati nel portale ministeriale, senza integrazione applicativa richiesta. [F02; F06 22/10; F07]

Glossario iniziale

Termine	Significato nel progetto
Banco	Centro operativo regionale che coordina richieste, erogatori, appuntamenti e rendicontazione.
OPT	Organizzazione Partner Territoriale; può richiedere servizi e offrire misure che svolge.
Operatore	Operatore interno al Centro PICUS o professionista esterno che eroga misure, conferma appuntamenti e presenta la propria scheda trimestrale. Operatori e volontari interni alle OPT restano nella gestione della OPT e non sono censiti individualmente. [F06; F07, Operatori]
Erogatore	Operatore interno, professionista esterno o OPT che può fornire una misura.
Assistito o nucleo	Destinatario del servizio, senza account o dati identificativi in PICUS.
Misura	Voce del catalogo di accompagnamento, aggiornabile dal Banco.
Richiesta	Domanda di una OPT per una misura rivolta a una persona o a un nucleo.
Appuntamento	Accordo di erogazione in presenza o a distanza, distinto dalla richiesta.
Scheda trimestrale	Dati personali e amministrativi dell'operatore e conteggi aggregati del trimestre; processo distinto dalle richieste.
Transazione di servizio	Scambio operativo relativo a una richiesta fra OPT, Banco ed erogatore; non indica un pagamento.
Conferma di ricezione	Riscontro relativo a una comunicazione inviata dal Banco. Il suo significato esplicito o tecnico va chiarito; non equivale automaticamente a una conferma di lettura.


A2 Stakeholder e contesto

Attività collegata S1-01 (#2). La mappa distingue gli utenti dell'applicazione dagli stakeholder esterni. Il Banco ha visibilità regionale; OPT e Operatori accedono alle sole informazioni pertinenti. Revisione del gruppo ancora da registrare.

Soggetto	Che cosa vuole?	Usa la web app?
Banco	Coordina richieste, erogatori e appuntamenti; monitora gli scambi di servizio; gestisce catalogo e creazione/revoca degli account OPT e Operatori. Il caricamento massivo CSV delle utenze OPT è opzionale. Invia comunicazioni con conferma di ricezione e raccoglie dati per la rendicontazione ministeriale.	Sì, con visione complessiva
OPT	Richiede una misura quando non può soddisfare il bisogno autonomamente e dichiara le misure che eroga. Un unico account e una sola email per OPT; la gestione del personale interno resta alla OPT. [F06, 20/10; F07, Flusso di una richiesta]	Sì, solo con i propri dati
Operatore interno PICUS / professionista esterno	Interni al Centro PICUS o professionisti esterni: erogano le misure, confermano gli appuntamenti e compilano la scheda trimestrale.	Sì, accesso personale
Persona o nucleo assistito	Ricevono la misura tramite l'OPT. Nessun accesso e nessun dato identificativo registrato.	No
Ministero e responsabile privacy	Il ministero riceve la rendicontazione; il responsabile privacy definisce la conservazione dei dati. Interlocutori dell'analisi, non ruoli applicativi.	No

Fonti F02 §§2–3, 5 e 7–8; F06 confronti del 20 e 22/10; F07. Sono confermati account unico ed email unica per OPT, assenza di documenti di registrazione, revoca manuale delle OPT cessate, credenziali senza scadenza automatica e ordine di arrivo delle richieste. Restano aperti: significato dei 230.000 utenti, categorie di operatori con accesso, competenze sull'appuntamento, vicinanza geografica, contenuti del monitoraggio OPT e semantica della conferma di ricezione. A6 conserva i relativi riscontri.

Context Diagram CTX 01

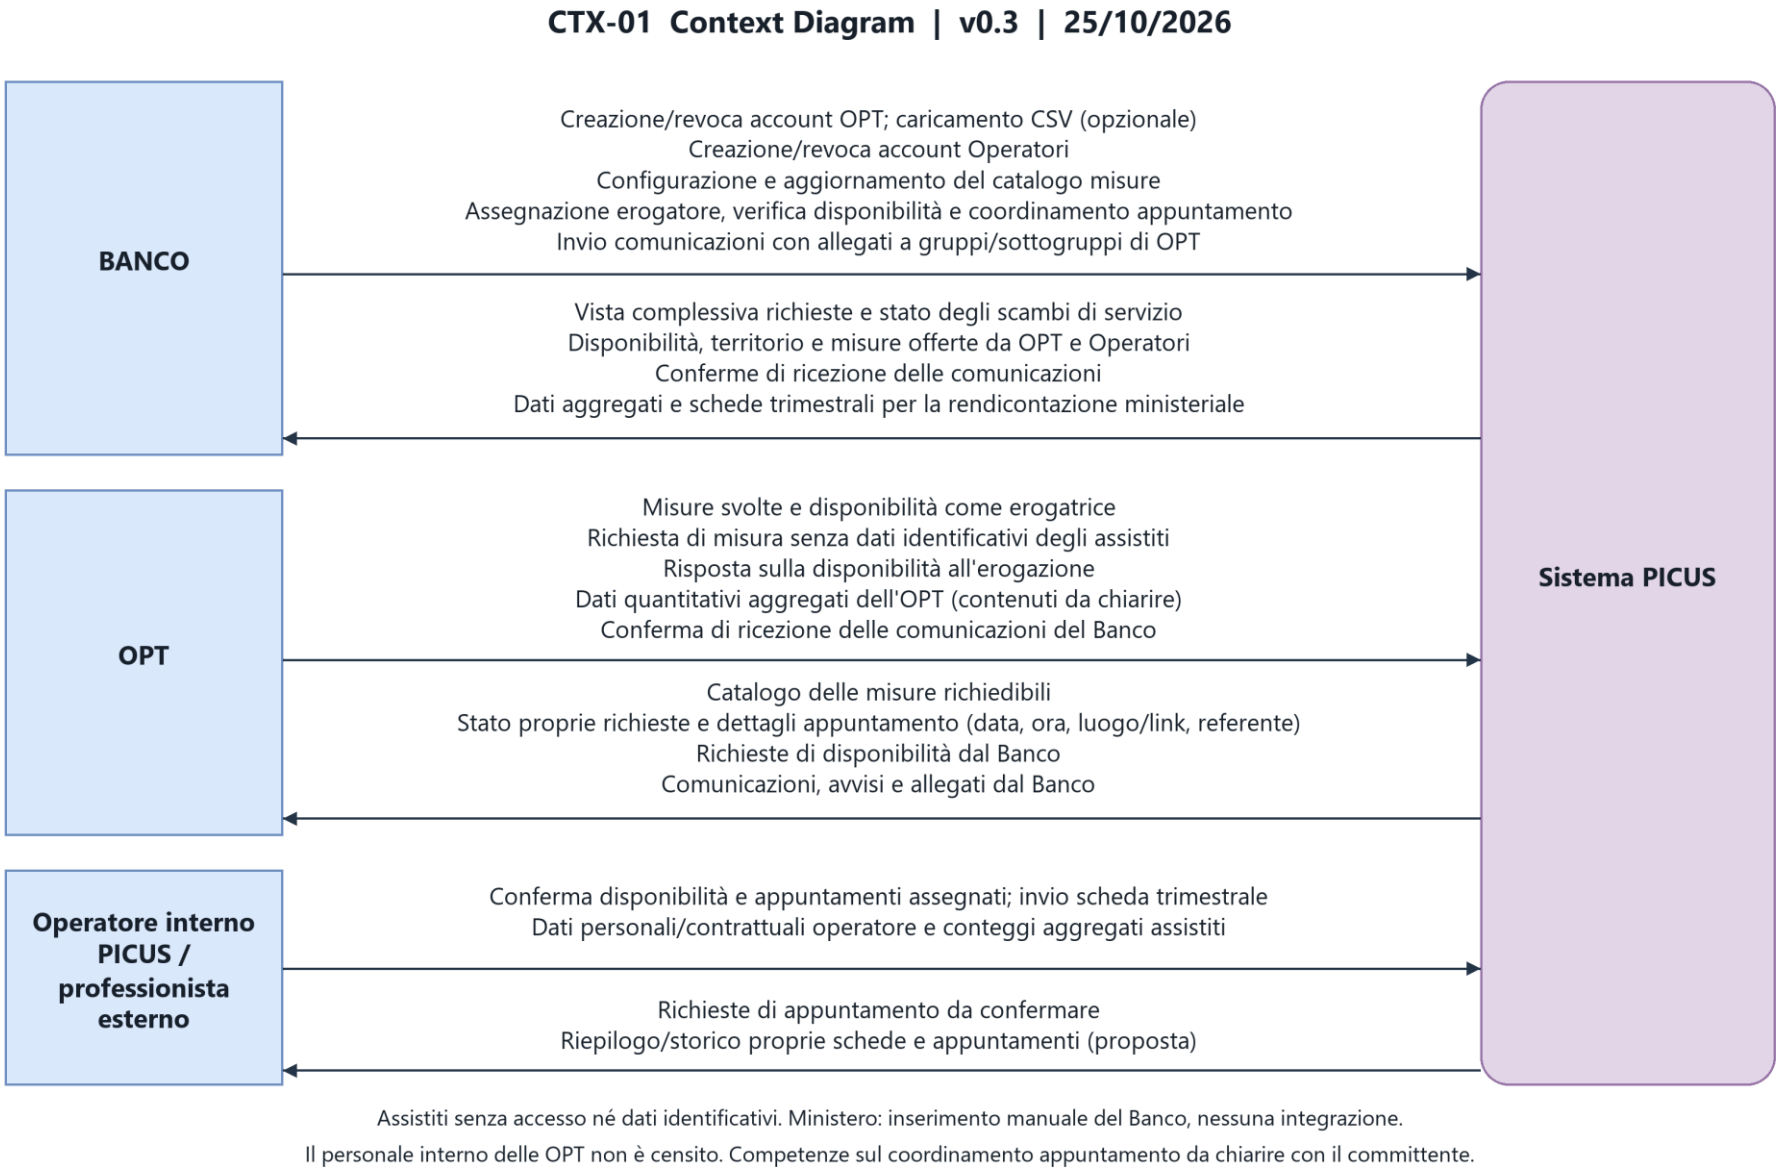

CTX-01 v0.3 del 25/10/2026. Correzioni del 21/10 integrate (F02, F06, F07; S1-01 #2 e #27). Revisione del gruppo da registrare. Sorgente drawio ed esportazione PNG in docs/requirements/diagrams/.

A3 Processo attuale e processo proposto

Processo attuale as is

Attività collegata S1-02 (#3). ASIS-01 ricostruisce il processo dalle fonti, senza descrivere software già esistente. Lo schema DiagrammaIniziale_PICUS.png è conservato come bozza di contesto: non mostra una sequenza completa di attività e decisioni ed è sostituito, per l'analisi di processo, dai due diagrammi Mermaid qui riportati.


Avvio e responsabilità. Una persona o un nucleo si rivolge alla propria OPT. Se la OPT può soddisfare il bisogno, eroga direttamente la misura con il proprio personale. Se non può farlo, contatta il Banco attraverso i canali manuali attuali. Il Banco individua un possibile erogatore e ne verifica la disponibilità; in caso di rifiuto prova un'altra soluzione. Se non può erogare, comunica l'impossibilità alla OPT. [F02 §§2–4; F06; F07]

Appuntamento ed esito. Quando è disponibile un erogatore, il Banco coordina i dettagli e ricontatta la OPT richiedente. La OPT informa e, quando necessario, accompagna la persona. La misura è erogata fuori dall'applicazione. F07 attribuisce al Banco la conferma finale; i canali con cui oggi apprende l'esito non sono documentati. Il conflitto fra fissare o soltanto proporre l'appuntamento resta aperto. [F07; F06 22/10]

Rendicontazione indipendente. Il singolo operatore interno PICUS o esterno compila la scheda del trimestre e la trasmette al Banco con gli strumenti correnti. Il Banco raccoglie i dati e li inserisce manualmente nel portale ministeriale. La scheda include dati personali dell'operatore e conteggi aggregati, anche per accessi diretti senza richiesta PICUS. Il personale interno delle OPT non invia una scheda personale al Banco. Il canale puntuale e le verifiche manuali richiedono conferma. [F02 §4, §5.5 e app. B; F06; F07]


Limiti dell'osservazione. Telefono, messaggi, documenti e schede separate sono espliciti in F02. Non sono disponibili tempi medi, frequenze di errore o una misura del numero di solleciti. Attese, duplicazioni e perdite di aggiornamento sono rischi motivati dalla frammentazione, non risultati di una rilevazione quantitativa.

ASIS 01A Richieste e appuntamenti

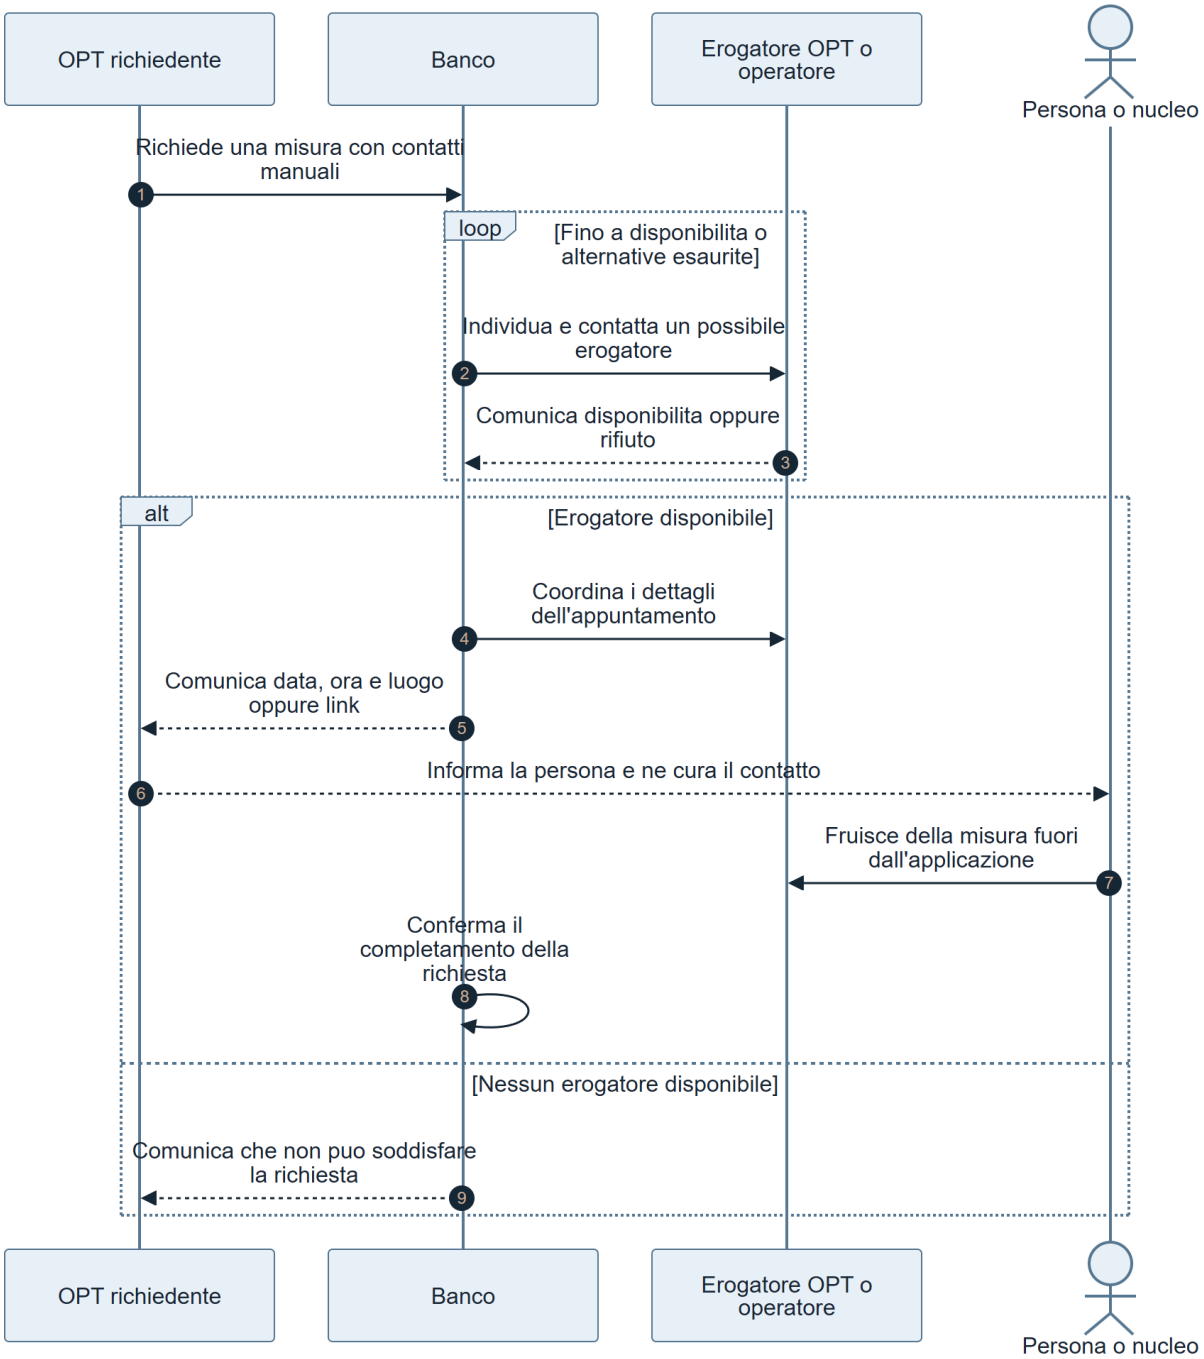

ASIS-01A v0.1 del 25/10/2026. Fonti F02 §§2–4 e 5.3, F06 e F07. Sorgente ASIS-01-richieste.mmd; ricostruzione da revisionare dal gruppo. Il flusso parte quando la OPT non può soddisfare autonomamente il bisogno. Competenze finali sull'appuntamento e modalità di aggiornamento dell'esito restano da chiarire.

ASIS 01B Rendicontazione trimestrale

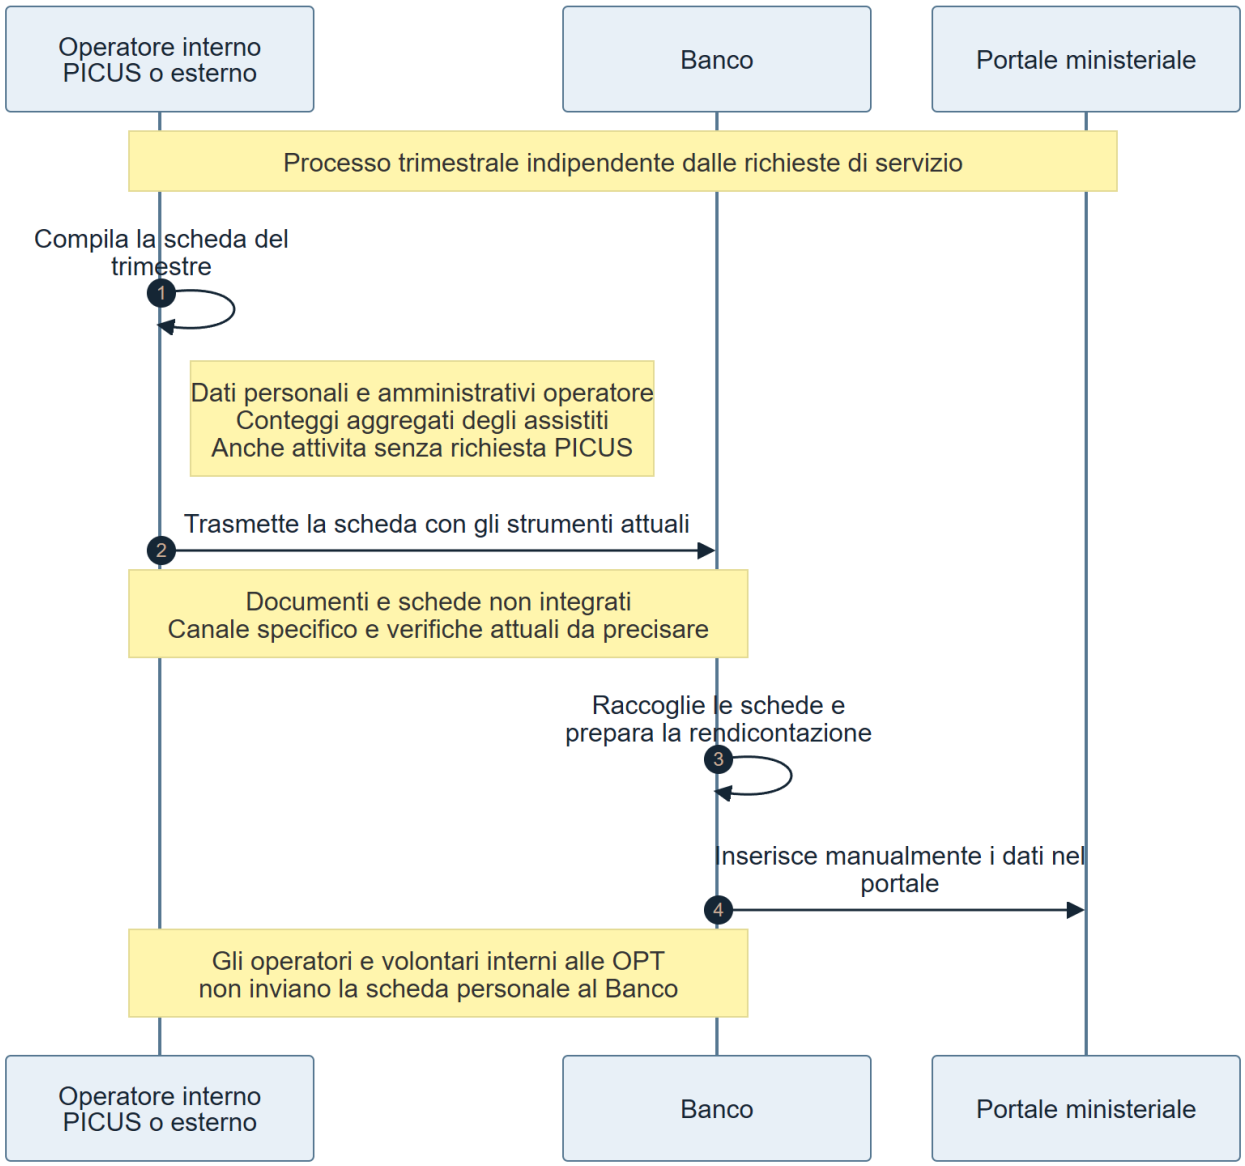

ASIS-01B v0.1 del 25/10/2026. Fonti F02 §4, §5.5 e app. B, F06 e F07. Sorgente ASIS-01-rendicontazione.mmd; canali correnti e controlli manuali non ulteriormente specificati. Revisione del gruppo da registrare.

Criticità del processo attuale

ID	Passaggio e problema	Evidenza e impatto
CR-01	Informazioni distribuite fra telefonate, messaggi, documenti e schede.	F02 §4: vista aggiornata e ricostruzione dello stato più difficili. Duplicazioni possibili, non misurate.
CR-02	Disponibilità e offerta territoriale non raccolte in una vista uniforme.	F02 §4: ricerca dell'erogatore più difficile; F07: contatti in sequenza.
CR-03	Coordinamento svolto tramite contatti manuali fra Banco, OPT ed erogatori.	F02 §4: rischio di ripetere richieste e solleciti o perdere un aggiornamento; quantità non rilevate.
CR-04	Dettagli dell'appuntamento ricostruiti da comunicazioni separate.	F02 §4 e §5.3: rischio di informazioni incomplete o non aggiornate per la OPT.
CR-05	Schede trimestrali trasmesse separatamente e dati poi inseriti nel portale.	F02 §4 e §5.5: raccolta non uniforme e passaggi manuali; errore di trascrizione è un rischio da verificare.

Processo proposto to be

Attività collegata S1-03 (#4). I tre diagrammi Mermaid sono prodotti come proposta del team. La domanda #29 è aperta senza risposta alla consultazione di F09: il confine del processo e la macchina a stati non sono una decisione definitiva del committente.

Proposta principale IP-01. PICUS coordina la richiesta fino a un appuntamento confermato. Accettata indica la chiusura del coordinamento, distinta dalla sola disponibilità dell'erogatore. Rifiutata indica che il Banco non ha trovato una soluzione. Il contenuto e l'esito della prestazione rimangono fuori dal flusso applicativo proposto. [#20; Q-04/#29]


Alternativa dalle fonti. F07 elenca In programmazione, Completata, Annullata e Rifiutata e attribuisce al Banco la conferma della prestazione svolta. Questa evidenza è conservata: se il committente richiede tale monitoraggio, vanno aggiornati TOBE-01B, US-D09 e il taglio MVP. Annullata richiede comunque attori, momenti e condizioni, anche se la chiusura fosse limitata al coordinamento. [F07; Q-04]

Invio e disponibilità. La OPT invia una richiesta strutturata priva di identificativi degli assistiti. PICUS valida dati e permessi, registra ID e data e la rende visibile alla OPT titolare e al Banco, che lavora in ordine cronologico. Il Banco sceglie manualmente un erogatore e riceve la sua risposta. Un rifiuto singolo permette una nuova ricerca; in assenza di risposta la richiesta resta in attesa. Nessun timeout o criterio automatico di prossimità è assunto. [IP-03, IP-06; US-D05–US-D07]

Appuntamento e chiusura del coordinamento. IP-02 propone che il Banco registri i dettagli concordati e ne attenda la conferma dall'erogatore prima della pubblicazione. Non si attribuisce al Banco il potere autonomo di fissare l'agenda. La OPT consulta i dettagli e contatta la persona fuori da PICUS. Solo a quel punto la proposta IP-01 chiude il coordinamento come Accettata. [Q-09; US-D08–US-D09]


Rendicontazione distinta. TOBE-02 descrive un altro processo: compilazione e invio della scheda del trimestre, raccolta del Banco e inserimento manuale nel portale. Può includere attività senza richiesta PICUS e non dipende dallo stato Accettata o Completata. Restano da confermare il perimetro degli operatori e le regole ulteriori di congruenza. [F02 §5.5; F07; Q-06, Q-11]

TOBE 01A Richiesta e disponibilità

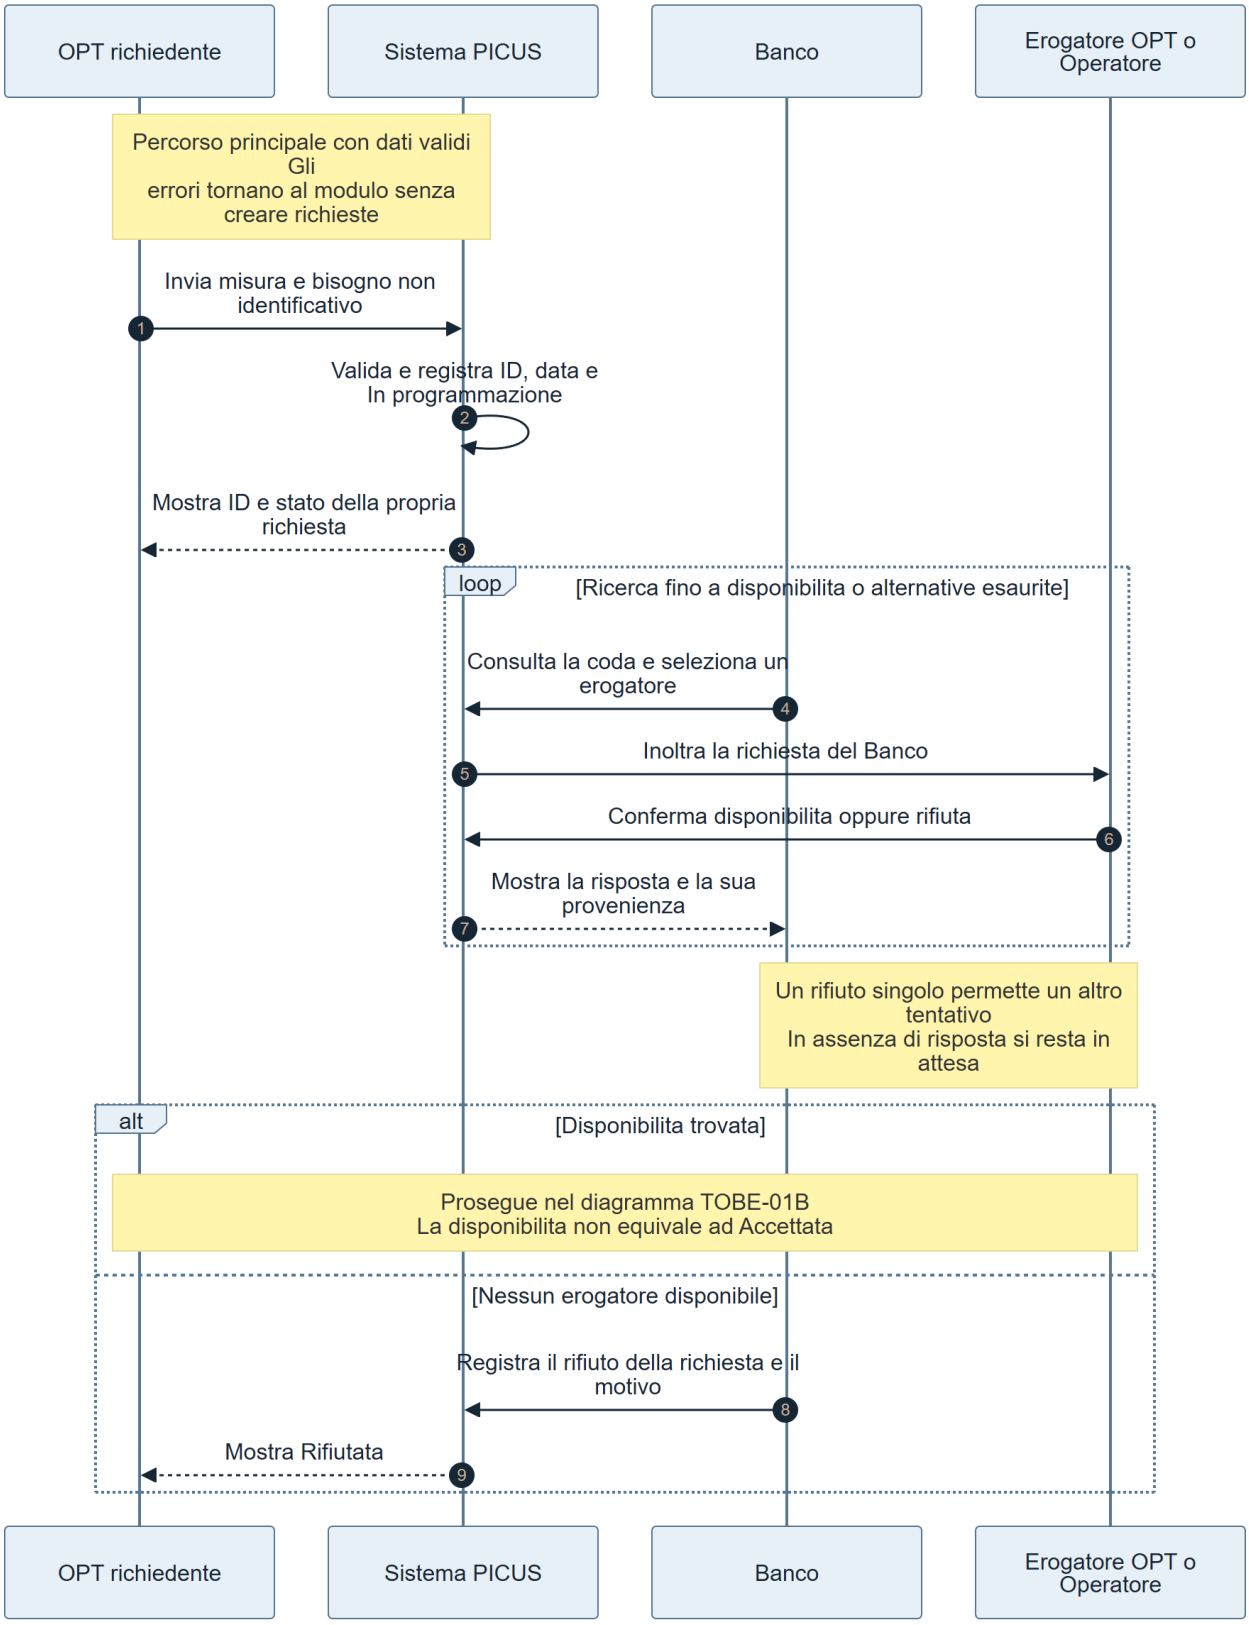


TOBE-01A v0.1 del 25/10/2026. Percorso principale valido; gli errori tornano al modulo senza creare richieste. Coda cronologica, ricerca manuale e rifiuti distinti. Proposta #20 con confine aperto nella #29. Sorgente Mermaid in docs/requirements/diagrams/.

TOBE 01B Appuntamento e chiusura

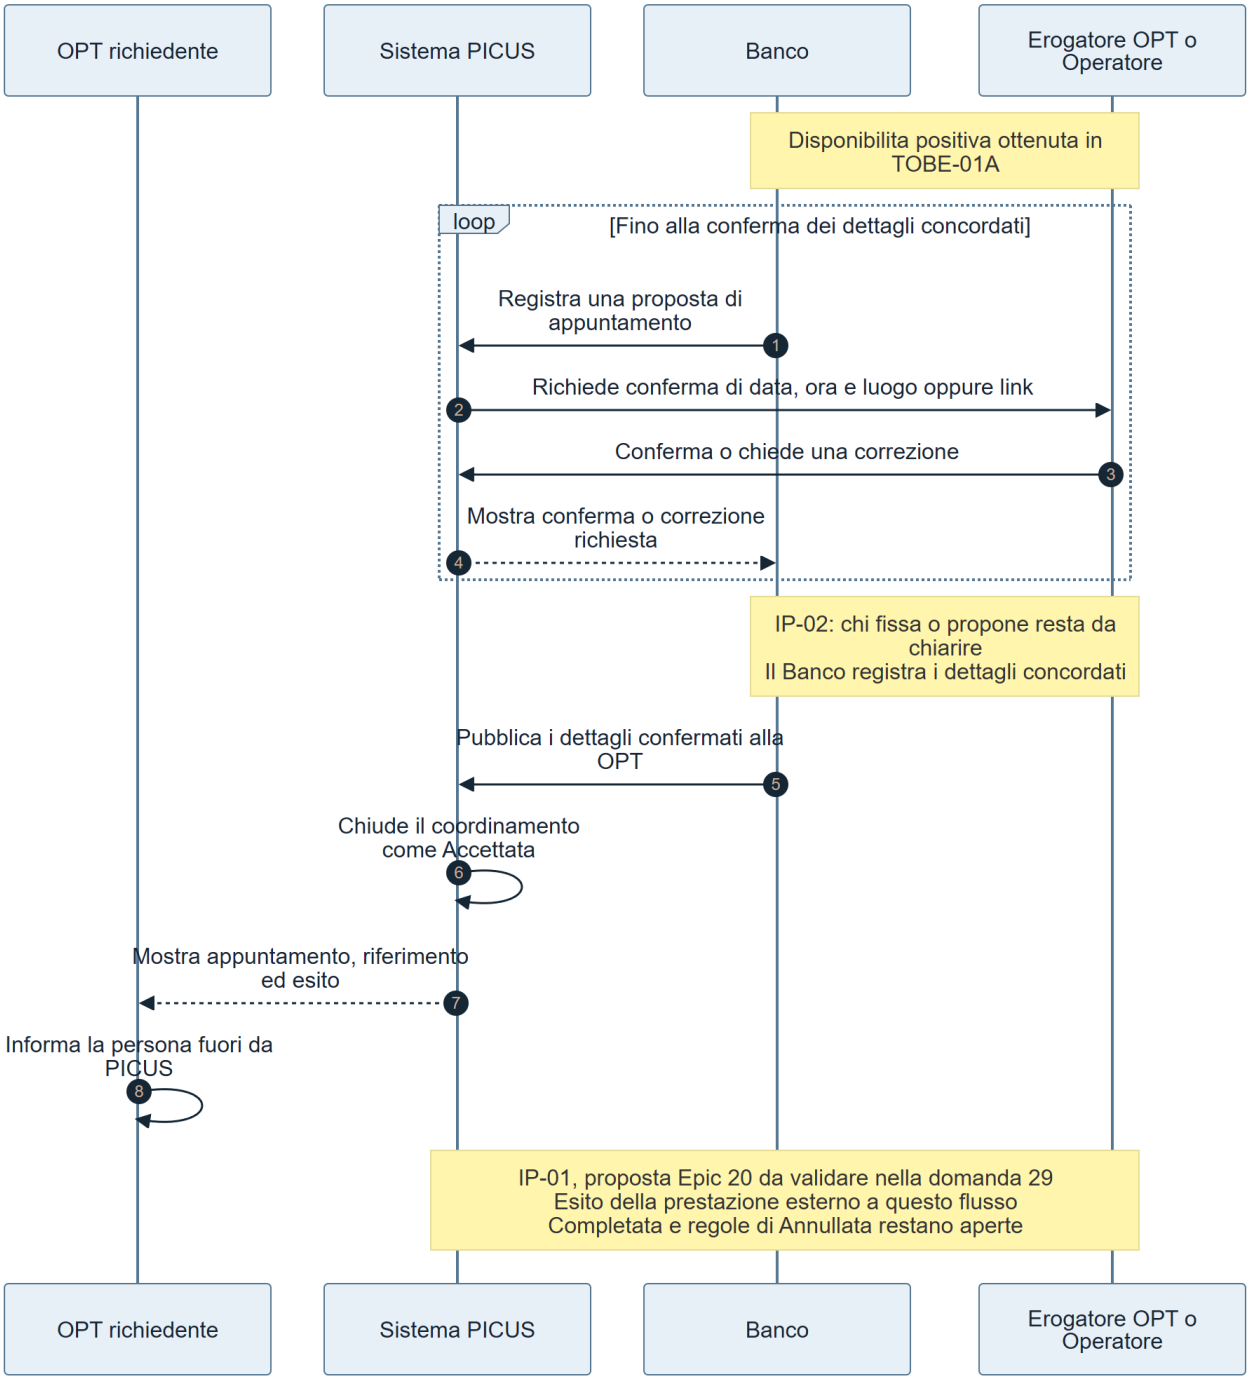

TOBE-01B v0.1 del 25/10/2026. IP-01: Accettata dopo conferma dell'appuntamento. IP-02: registrazione di dettagli concordati. Entrambe le ipotesi sono da validare; Completata e regole di Annullata restano in Q-04/#29.

TOBE 02 Rendicontazione trimestrale

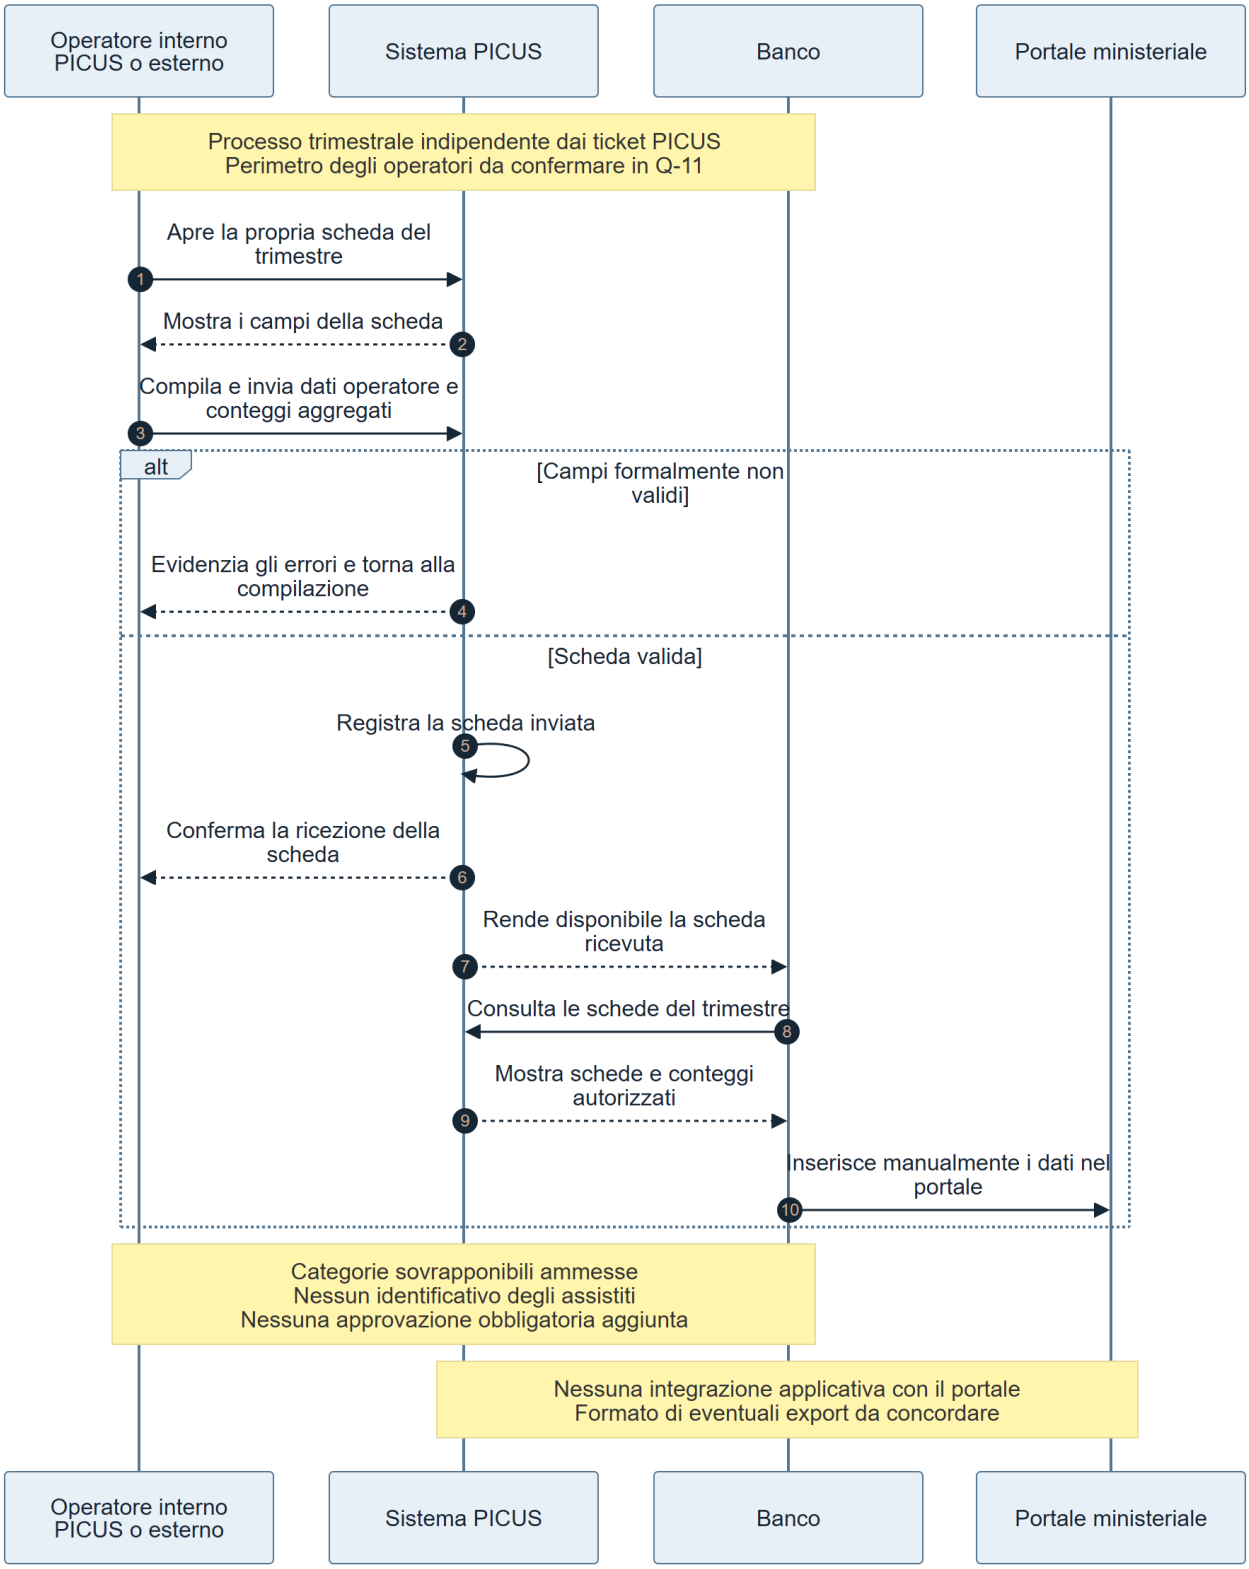

TOBE-02 v0.1 del 25/10/2026. Processo autonomo dalle richieste, con categorie sovrapponibili e inserimento ministeriale manuale. Perimetro degli operatori in Q-11; nessuna approvazione obbligatoria o integrazione API introdotta.

Miglioramenti e criteri di riscontro

ID e criticità	Modifica proposta	Beneficio osservabile e storie
MIG-01 / CR-01	Richiesta identificabile, coda e stato in un'unica vista.	Banco e OPT titolare ritrovano lo stesso ID e stato. US-D05, US-D09.
MIG-02 / CR-02	Offerta dichiarata e risposta puntuale dell'erogatore.	Banco distingue offerta, disponibilità confermata, rifiuto e attesa. US-D04, US-D06, US-D07.
MIG-03 / CR-03	Inoltro e risposte nell'applicazione, mantenendo il Banco al centro.	Una risposta è consultabile senza ricostruirla da messaggi esterni. US-D06, US-D07.
MIG-04 / CR-04	Dettagli strutturati per presenza e distanza.	La OPT trova tutti i dati necessari nella propria pratica. US-D08.
MIG-05 / CR-05	Scheda digitale e controlli formali con categorie sovrapponibili.	Il Banco riceve la scheda senza un collegamento obbligatorio alle richieste. US-D13, US-D14.

Le misure qui indicate verificano la disponibilità e la coerenza delle informazioni. Riduzioni percentuali di tempi, errori o contatti richiedono prima una rilevazione dell'as-is; non sono riportati miglioramenti numerici non misurati.

Ciclo di vita delle richieste

La tabella descrive il modello proposto, non una correzione delle risposte del committente. La scelta del confine è esplicitamente aperta in Q-04/#29. La conferma di disponibilità è un'informazione del coordinamento e non coincide con l'accettazione dell'appuntamento.

Passaggio	Regola proposta	Fonte e stato
Invio → In programmazione	La OPT invia; PICUS valida e registra ID, data e titolare. Il Banco vede la coda cronologica.	Stato comune alle alternative; schema non identificativo proposto in IP-03.
In programmazione → In programmazione	Un erogatore rifiuta o non risponde; il Banco può cercare un'alternativa.	Nessuna chiusura automatica, urgenza o scadenza non concordata.
In programmazione → Accettata	Il Banco pubblica i dettagli concordati dopo conferma dell'erogatore; termina il coordinamento applicativo.	IP-01/IP-02: proposta #20 da validare in #29 e Q-09. Non equivale a prestazione svolta.
In programmazione → Rifiutata	Il Banco non trova una soluzione e registra l'esito con motivo consultabile dalla OPT.	Rifiuto previsto da F07; dettaglio della motivazione proposto dal team.
Completata e Annullata	F07 li include; la gestione in PICUS dipende dal confine richiesto e dalle responsabilità da chiarire.	Variante da risolvere in Q-04/#29. Non si definiscono transizioni implicite.

Backlog, Ready, In progress, In review e Done descrivono il lavoro del team e non il dominio PICUS. La risposta a #29 richiederà un aggiornamento coerente di testi, diagrammi, US-D09, MVP e criteri di verifica.

A4 Epic backlog e User Story

Attività collegate S1-04 (#5), S1-05 (#6), S1-06 (#7). Questa sezione contiene una fotografia delle issue pubbliche del 25/10/2026 e una proposta documentale di raffinamento. Non sostituisce il Project come fonte operativa per ordine, assegnatari e avanzamento. [F08]

Registro delle Epic

Le cinque Epic presenti sono #18, #19, #20, #22 e #23. Gli ID EP-xx seguenti coincidono con il numero della issue, evitando l'ambiguità della vecchia numerazione EPIC 1–5. Le aree funzionali non impongono altrettanti moduli architetturali.

ID e issue	Valore e perimetro	Fonti e storie
EP-18 / #18	Identità, profili e accessi. Banco amministra utenze; OPT con account unico; Operatori con accesso personale. Isolamento per ruolo e appartenenza. CSV opzionale. Esclusi account degli assistiti e gestione del personale interno delle OPT.	F02 §5.1 e §7; F06; F07. US-24–28, US-D01–02.
EP-19 / #19	Catalogo configurabile e offerta territoriale. Il Banco aggiorna le misure; le OPT dichiarano quelle effettivamente erogate. Esclusi turni e personale interno; contenuti del monitoraggio quantitativo OPT e criterio di vicinanza restano aperti.	F02 §5.2; F07. US-D03–04.
EP-20 / #20	Richieste e coordinamento appuntamenti. OPT richiede, Banco seleziona erogatore e coordina, erogatore risponde, Banco registra l'esito. Esclusi emergenze, dati identificativi e gestione della prestazione. Regole su appuntamento e annullamento aperte.	F02 §5.3; F06; F07. US-D05–10.
EP-22 / #22	Comunicazioni e conferma di ricezione. Banco invia testo e allegati a destinatari selezionati; OPT fornisce il riscontro. Escluse chat fra OPT e webmail. Semantica della conferma e vincolo broadcast da chiarire.	F02 §5.4; F06. US-D11–12.
EP-23 / #23	Schede trimestrali e rendicontazione. Operatori compilano dati personali e conteggi aggregati; Banco raccoglie le schede per inserimento manuale nel portale. Nessun legame obbligatorio con una richiesta; nessuna API ministeriale.	F02 §5.5 e app. B; F07. US-D13–14.

Fotografia e proposta del backlog

Fotografia GitHub usata nella v0.4. La prima compilazione di A4 si basava sulle cinque Story #24–#28 nell'Epic #18. Gli aggiornamenti del backlog eseguiti in parallelo dal gruppo non sono dedotti da quella fotografia: il Project e le issue restano la fonte operativa per stato, ordine e assegnatari.

Raffinamento proposto. Il catalogo conserva 19 storie documentali e gli ID US-D01–US-D14 della proposta iniziale. Collegare questi ID alle issue create o raffinate durante l'allineamento GitHub, senza cambiarne silenziosamente il significato. Le correzioni IAM e il taglio di #20 restano proposte finché non sono discusse e recepite.

Ordine e priorità. La sequenza seguente è una proposta da sottoporre al PO: prima gli accessi minimi e il percorso richiesta–erogatore–appuntamento–esito, poi gestione del catalogo, rendicontazione e comunicazioni; il CSV opzionale viene dopo la creazione ordinaria. P1/P2/P3 indicano la priorità proposta. Dimensioni e stime spettano ai Developers e non sono inventate in questa compilazione.

Ordine proposto del backlog

Ordine proposto	Storia e priorità	Epic e stato
1	US-25 Autenticazione e recupero delle credenziali P1	#18 — issue #25; scheda proposta
2	US-28 Accessi per ruolo e appartenenza P1	#18 — issue #28; scheda proposta
3	US-D01 Creazione manuale di una utenza OPT P1	#18 — candidata documento; abbinare issue
4	US-D04 Dichiarazione delle misure erogate dalla OPT P1	#19 — candidata documento; abbinare issue
5	US-27 Creazione e attivazione dell'account Operatore P1	#18 — issue #27; scheda proposta
6	US-D05 Invio di una richiesta di misura P1	#20 — candidata documento; abbinare issue
7	US-D06 Scelta dell'erogatore e richiesta di disponibilità P1	#20 — candidata documento; abbinare issue
8	US-D07 Risposta alla richiesta di disponibilità P1	#20 — candidata documento; abbinare issue
9	US-D08 Coordinamento e comunicazione dell'appuntamento P1	#20 — candidata documento; abbinare issue
10	US-D09 Chiusura o rifiuto della richiesta P1	#20 — candidata documento; abbinare issue
11	US-26 Revoca manuale dell'utenza di una OPT P1	#18 — issue #26; scheda proposta
12	US-D02 Revoca dell'account Operatore P1	#18 — candidata documento; abbinare issue
13	US-D03 Aggiornamento del catalogo misure P2	#19 — candidata documento; abbinare issue
14	US-D13 Compilazione e invio della scheda trimestrale P2	#23 — candidata documento; abbinare issue
15	US-D14 Riepilogo delle schede per la rendicontazione P2	#23 — candidata documento; abbinare issue
16	US-D11 Invio di comunicazioni a destinatari selezionati P2	#22 — candidata documento; abbinare issue
17	US-D12 Conferma di ricezione delle comunicazioni P2	#22 — candidata documento; abbinare issue
18	US-D10 Annullamento della richiesta P2	#20 — candidata documento; abbinare issue
19	US-24 Import annuale delle utenze OPT da CSV P3	#18 — issue #24; scheda proposta

Gli ID US-Dxx sono locali al documento e non sono numeri GitHub. Se il PO accoglie una candidata, la nuova issue dovrà essere collegata all'ID stabile, alla Epic e agli eventuali miglioramenti MIG. Il presente catalogo non costituisce selezione dell'MVP né impegno di implementazione in S1.

Schede dettagliate delle storie

Sono sviluppate otto schede con criteri osservabili e casi negativi. Requisiti delle fonti, scelte proposte e domande aperte sono distinti in ciascuna scheda. Le soglie numeriche proposte richiedono validazione. Per le altre candidate seguono schede sintetiche da raffinare quando la loro priorità sale.

US-25 Autenticazione e recupero delle credenziali

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima non effettuata

Come utente Banco, OPT o Operatore, voglio accedere con email e password e recuperare una password dimenticata, affinché possa usare le funzioni del mio ruolo anche da smartphone.

Stato e fonte. Accesso previsto dalle fonti. Ruolo Banco e criteri misurabili sono raffinamenti proposti della #25. Fonti: F02 §§3, 5.1 e 7; F08 #25.

Dipendenze e punti aperti. Account già creato; invio email. Durata del link, viewport e limiti ai tentativi sono soglie proposte, da validare.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1 — Accesso	Dato un account attivo di ciascuno dei tre ruoli, quando le credenziali sono corrette, allora si apre la relativa area riservata; con credenziali errate l'accesso è negato senza creare una sessione autenticata.
AC2 — Recupero	Dato un account attivo, quando viene richiesto il recupero, allora il sistema invia un link monouso valido 15 minuti; dopo il cambio password il link non è più utilizzabile. Soglia proposta.
AC3 — Email sconosciuta o utenza revocata	Dato un indirizzo non registrato o revocato, quando viene chiesto il recupero, allora non viene inviato alcun link e appare lo stesso messaggio generico usato per un account attivo.
AC4 — Link scaduto	Dato un link scaduto o già usato, quando viene aperto, allora la password resta invariata e viene proposta una nuova richiesta di recupero.
AC5 — Uso mobile	Dato un viewport di 360 CSS pixel, quando si usano accesso e recupero, allora etichette, campi, messaggi e pulsanti sono leggibili e utilizzabili senza scorrimento orizzontale. Soglia proposta.
AC6 — Tentativi ripetuti	Dati cinque tentativi di accesso errati sullo stesso account in cinque minuti, quando arriva un ulteriore tentativo entro 60 secondi, allora l'accesso è negato con un messaggio generico di attesa. Soglie proposte da validare.

Riferimento operativo: issue #25

US-28 Accessi per ruolo e appartenenza

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima non effettuata

Come utente di PICUS, voglio accedere soltanto alle informazioni consentite dal mio ruolo e dalla mia organizzazione, affinché possa proteggere le informazioni delle altre OPT e degli operatori.

Stato e fonte. Vincolo concordato e trasversale. La distinzione 401/403 e le prove di appartenenza sono raffinamenti proposti della #28. Fonti: F02 §§3 e 7; F08 #28.

Dipendenze e punti aperti. Si applica progressivamente a ogni funzione. Gli esempi di richieste, appuntamenti e schede diventano prove eseguibili quando quelle funzioni esistono; nessun API Gateway è imposto.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1 — Isolamento OPT	Date due OPT distinte, quando OPT A richiede o modifica una risorsa intestata a OPT B, anche cambiando l'identificativo nella richiesta, allora riceve 403, non ottiene dati di B e nessun dato viene modificato.
AC2 — Operatore	Dato un Operatore autenticato, quando consulta appuntamenti e schede, allora vede solo quelli assegnati a lui e le proprie schede; l'accesso ai dati di un altro operatore è negato.
AC3 — Banco	Dato il Banco autenticato, quando consulta il coordinamento, allora accede alle richieste regionali, alle disponibilità e alle schede necessarie al proprio ruolo.
AC4 — Codici distinti	Dato un accesso privo di autenticazione valida a una risorsa protetta, quando viene effettuato, allora è negato con 401; con autenticazione valida e permesso mancante è negato con 403.
AC5 — Controllo sul server	Dato un client che nasconde o altera campi di ruolo e OPT, quando invia una richiesta, allora il server verifica identità e appartenenza dalla sessione attendibile e non dai valori manipolati.

Riferimento operativo: issue #28

US-D01 Creazione manuale di una utenza OPT

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima non effettuata

Come Amministratore del Banco, voglio registrare una singola OPT e crearne l'account, affinché possa abilitare nuove organizzazioni senza dipendere dal CSV opzionale.

Stato e fonte. Nuova storia proposta, non pubblicata. Copre la creazione ordinaria richiesta dalle fonti. Fonti: F02 §5.1; F06, 20/10; revisione del 25/10, appendice B.

Dipendenze e punti aperti. Unico account/email per OPT. Codice struttura, nome, comune, codice fiscale ed email sono il set di campi proposto. Attivazione condivisa con US-27; durata e policy sono proposte.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1 — Creazione	Dato il Banco autorizzato, quando inserisce i campi validi della OPT e conferma, allora si crea una utenza in attesa di attivazione e viene inviato il link di primo accesso alla email indicata.
AC2 — Errori e duplicati	Dati campi obbligatori mancanti, codice struttura già registrato o email già usata da un account non revocato, quando il Banco conferma, allora non nasce una seconda utenza e il motivo è mostrato.
AC3 — Attivazione	Dato un link valido di attivazione, quando il referente imposta la password secondo la policy proposta in US-27, allora l'account diventa Attivo, senza scadenza periodica automatica.
AC4 — Permessi	Dato un utente OPT o Operatore, quando tenta di creare una utenza OPT, allora riceve 403 e non viene registrata alcuna organizzazione.

Registrazione: proposta con ID locale; collegare alla issue corrispondente nell'allineamento del backlog.

US-27 Creazione e attivazione dell'account Operatore

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima non effettuata

Come Amministratore del Banco, voglio creare l'account personale di un operatore interno PICUS o professionista esterno, affinché possa consentirgli conferme degli appuntamenti e invio delle proprie schede.

Stato e fonte. Accesso personale confermato. Questa scheda propone di restringere #27 a creazione e attivazione; la revoca è in US-D02. La issue non è stata modificata. Fonti: F02 §5.1 e §6; F07 Operatori; F08 #27.

Dipendenze e punti aperti. Catalogo iniziale delle 12 misure; territorio e dati obbligatori da validare. Attivazione tramite link, validità 72 ore e password di 12 caratteri sono proposte, condivise con US-D01.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1 — Creazione	Dato il Banco autorizzato, quando inserisce nome, cognome, email, codice fiscale, qualifica interno/esterno, misure e territorio e conferma, allora viene creato un account Operatore in attesa di attivazione ed è inviato un link monouso.
AC2 — Validazione	Dati campi obbligatori mancanti, email o codice fiscale formalmente non validi, oppure email già usata da un account non revocato, quando viene confermato il modulo, allora nessun account viene creato e gli errori sono indicati.
AC3 — Attivazione	Dato un link non usato entro 72 ore, quando l'operatore imposta una password di almeno 12 caratteri, allora l'account diventa Attivo e accede solo alle funzioni Operatore. Entrambe le soglie sono proposte.
AC4 — Scadenza e reinvio	Dato un link scaduto o usato, quando viene aperto, allora non permette il cambio password. Il Banco può reinviare il link per un account in attesa, invalidando il precedente.
AC5 — Perimetro	Dato un utente OPT o Operatore, quando tenta di creare account, allora riceve 403. Gli operatori e volontari interni alle OPT non vengono censiti come utenze personali.

Riferimento operativo: issue #27

US-D05 Invio di una richiesta di misura

Epic #20 | Priorità proposta P1 | Stima non effettuata

Come referente OPT, voglio inviare al Banco una richiesta per una persona o un nucleo che non posso assistere autonomamente, affinché possa ottenere il coordinamento di una misura adeguata.

Stato e fonte. Nuova storia proposta, non pubblicata. Prima parte del flusso end-to-end candidato. Fonti: F02 §5.3; F06, 20 e 22/10; F07 Flusso di una richiesta.

Dipendenze e punti aperti. IAM e catalogo. Campi proposti: misura, persona/nucleo, comune; schema non identificativo da validare. Nessun campo per nominativi o allegati degli assistiti.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1 — Registrazione	Data una OPT attiva, quando invia una misura di catalogo con i campi proposti validi, allora il sistema registra ID, data di arrivo, OPT titolare e stato In programmazione e mostra una conferma.
AC2 — Dati mancanti	Data una misura assente o un campo obbligatorio non compilato, quando la OPT invia, allora nessuna richiesta viene creata e vengono indicati i campi da correggere.
AC3 — Coda e visibilità	Data una richiesta registrata, quando il Banco apre la coda, allora la trova in ordine cronologico; quando la OPT consulta le proprie richieste, allora ne vede ID e stato. Non viene aggiunta una priorità di urgenza.
AC4 — Privacy e permessi	Dato il modulo, quando viene compilato, allora non prevede dati identificativi degli assistiti. Un'altra OPT non può consultare o modificare la richiesta e riceve 403.

Registrazione: proposta con ID locale; collegare alla issue corrispondente nell'allineamento del backlog.

US-26 Revoca manuale dell'utenza di una OPT

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima non effettuata

Come Amministratore del Banco, voglio revocare l'utenza di una OPT cessata, affinché possa impedire ulteriori accessi senza cancellare lo storico.

Stato e fonte. Capacità concordata, presente nella #26. Dettagli operativi dei criteri proposti per renderla verificabile. Fonti: F06, 20/10; F02 §5.1; F08 #26.

Dipendenze e punti aperti. Account e gestione delle sessioni; conservazione/cancellazione dei dati resta una questione distinta. Gestione delle richieste aperte della OPT da chiarire.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1 — Revoca	Data una utenza OPT attiva o in attesa di attivazione, quando il Banco conferma la revoca, allora lo stato diventa Revocato e sessioni e link di attivazione ancora validi vengono invalidati.
AC2 — Accesso negato	Data una utenza revocata, quando prova ad autenticarsi o riusare una sessione precedente, allora non può accedere alle risorse protette.
AC3 — Dati storici	Date richieste e dati della OPT già registrati, quando viene revocato l'account, allora restano consultabili dal Banco e non sono cancellati dalla revoca.
AC4 — Ripetizione e permessi	Data una utenza già revocata, quando il Banco ripete l'operazione, allora lo stato resta Revocato senza duplicare effetti. Un utente OPT o Operatore che tenta la revoca riceve 403.

Riferimento operativo: issue #26

US-D02 Revoca dell'account Operatore

Epic #18 | Priorità proposta P1 | Stima non effettuata

Come Amministratore del Banco, voglio revocare l'accesso di un operatore il cui incarico è terminato, affinché possa proteggere l'applicazione conservando le schede già inviate.

Stato e fonte. Nuova storia proposta per separare la revoca dalla creazione prevista in #27; non pubblicata. Fonti: F08 #27, criterio di revoca; revisione del 25/10, appendice A.

Dipendenze e punti aperti. Riusa US-26. Gestione degli appuntamenti pendenti, riattivazione e riuso della email da chiarire; nessuna conservazione illimitata viene assunta come requisito.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1 — Revoca	Dato un account Operatore attivo o in attesa, quando il Banco conferma la revoca, allora diventa Revocato e sessioni e link di attivazione sono invalidati.
AC2 — Accessi successivi	Dato un account revocato, quando tenta login o recupero password, allora non accede e non riceve un link di recupero; il messaggio di recupero resta generico come in US-25.
AC3 — Schede conservate	Date schede già inviate, quando l'account è revocato, allora rimangono disponibili al Banco senza essere cancellate o riscritte dalla revoca. Non si introduce uno stato di approvazione della scheda.
AC4 — Permessi	Dato un utente OPT o Operatore, quando tenta di revocare un operatore, allora riceve 403 e non cambia alcuno stato.

Registrazione: proposta con ID locale; collegare alla issue corrispondente nell'allineamento del backlog.

US-24 Import annuale delle utenze OPT da CSV

Epic #18 | Priorità proposta P3 | Stima non effettuata

Come Amministratore del Banco, voglio importare il file annuale delle OPT, affinché possa ridurre gli inserimenti ripetitivi senza alterare gli accessi gia esistenti.

Stato e fonte. Funzionalità opzionale nella fonte. Raffinamento proposto della #24, che su GitHub la presenta ancora come obbligatoria. Fonti: F06, 20/10; F02 §5.1; F08 #24.

Dipendenze e punti aperti. Catalogo delle OPT e attivazione account condivisa con US-D01 e US-27. Colonne e gestione delle righe esistenti sono proposte del team.

AC	Condizione azione ed esito atteso
AC1 — File valido	Dato un CSV UTF-8 con codice struttura, nome OPT, comune, codice fiscale ed email, quando il Banco conferma, allora ogni nuova riga valida crea una utenza in attesa di attivazione e produce le istruzioni di primo accesso.
AC2 — Errori	Dato un file illeggibile o con colonne mancanti, quando viene caricato, allora non viene importato alcun account. Per righe non valide in un file leggibile, vengono importate solo le valide e viene mostrato numero di riga e motivo dello scarto.
AC3 — OPT esistente	Dato un codice struttura già registrato, quando la riga viene elaborata, allora nome e comune possono essere aggiornati senza cambiare password, stato o email; una email diversa è segnalata per gestione manuale.
AC4 — OPT assente o revocata	Date OPT assenti dal nuovo file o già revocate, quando termina l'import, allora nessuna viene disattivata o riattivata automaticamente e le credenziali non ricevono una scadenza periodica.
AC5 — Permessi	Dato un utente OPT o Operatore autenticato, quando tenta l'import, allora riceve 403 e nessun dato cambia; un accesso non autenticato riceve 401.

Riferimento operativo: issue #24

Storie candidate catalogo e offerta

US-D03 Aggiornamento del catalogo misure

Come utente Banco, voglio aggiungere o modificare le misure del catalogo, affinché possa adattare l'offerta senza uno sviluppatore.

Epic #19 | Priorità proposta P2. Nuova storia proposta su capacità richiesta. Fonti: F02 §5.2 e appendice A; F07 Operatori.

Criteri iniziali. Una modifica valida del Banco è visibile alle OPT senza rilascio software; una OPT non può modificare il catalogo; le richieste esistenti conservano il significato della misura selezionata.

Dipendenze e dubbi. Catalogo iniziale delle 12 misure; trattamento delle misure già usate da precisare.

US-D04 Dichiarazione delle misure erogate dalla OPT

Come referente OPT, voglio indicare le misure che la mia organizzazione svolge, affinché possa renderle individuabili dal Banco per altre richieste.

Epic #19 | Priorità proposta P1. Nuova storia proposta su capacità confermata. Fonti: F02 §5.2; F07 Operatori.

Criteri iniziali. La OPT salva misure del catalogo solo per sé; il Banco le consulta; nessun operatore o volontario interno viene censito individualmente.

Dipendenze e dubbi. Catalogo; una misura dichiarata è effettivamente svolta. Dati quantitativi della OPT separati e da chiarire.

Storie candidate coordinamento delle richieste

US-D06 Scelta dell'erogatore e richiesta di disponibilità

Come utente Banco, voglio consultare offerta e territorio e interpellare un erogatore, affinché possa trovare chi può soddisfare la richiesta mantenendo il coordinamento.

Epic #20 | Priorità proposta P1. Nuova storia proposta. Criterio di vicinanza e priorità tra tipi di erogatore aperti. Fonti: F02 §5.3; F06 e F07.

Criteri iniziali. Il Banco seleziona un erogatore compatibile con la misura; l'inoltro e l'attesa sono visibili al Banco; dopo un rifiuto può scegliere un altro erogatore senza duplicare la richiesta originaria.

Dipendenze e dubbi. Richiesta e offerta note; nessun abbinamento automatico assunto.

US-D07 Risposta alla richiesta di disponibilità

Come OPT erogatrice o Operatore, voglio confermare o rifiutare la disponibilità richiesta dal Banco, affinché possa permettere al Banco di coordinare una soluzione effettiva.

Epic #20 | Priorità proposta P1. Nuova storia proposta su collaborazione prevista. Fonti: F02 §5.3; F07 Flusso di una richiesta.

Criteri iniziali. Il destinatario risponde solo alle richieste rivolte a lui; il Banco vede l'esito; un rifiuto non rifiuta automaticamente l'intera pratica. In assenza di risposta non scatta un timeout non concordato.

Dipendenze e dubbi. US-D06; destinatari e deleghe da precisare per le diverse tipologie.

US-D08 Coordinamento e comunicazione dell'appuntamento

Come utente Banco, voglio raccogliere la conferma e rendere disponibili i dettagli dell'appuntamento, affinché possa consentire alla OPT di informare correttamente la persona.

Epic #20 | Priorità proposta P1. Nuova storia proposta; chi fissa, propone e conferma i dettagli è da chiarire. Fonti: F02 §5.3; F07; conflitto F06 del 22/10.

Criteri iniziali. In presenza sono disponibili data, ora, luogo e referente; a distanza data, ora e link. L'operatore conferma al Banco e la OPT titolare consulta i dettagli; la comunicazione all'assistito resta esterna.

Dipendenze e dubbi. Disponibilità positiva; IP-02/Q-09 per la conferma dei dettagli. Accettata segue la pubblicazione, in US-D09/IP-01.

US-D09 Chiusura del coordinamento

Come utente Banco, voglio registrare l'esito del coordinamento e renderlo visibile alla OPT, affinché sappia se dispone di un appuntamento confermato oppure se la richiesta non può essere soddisfatta.

Epic #20 | Priorità proposta P1. IP-01: proposta provvisoria collegata a Q-04/#29. F07 conserva l'alternativa con Completata; non si dichiara che il committente abbia già scelto il modello ridotto.

Criteri iniziali. Dopo la conferma dell'appuntamento e la pubblicazione dei dettagli, lo stato proposto è Accettata. Se il Banco non trova un erogatore, registra Rifiutata e un motivo visibile alla OPT. Una disponibilità positiva o un singolo rifiuto dell'erogatore non chiudono da soli la richiesta. OPT e Operatori non possono sostituirsi al Banco nella chiusura.

Dipendenze e dubbi. US-D08, IP-01/IP-02 e risposta a #29. Se serve il monitoraggio della prestazione, estendere il taglio con la conferma Completata e ridefinire i criteri prima della costruzione.

US-D10 Annullamento della richiesta

Come soggetto autorizzato da definire, voglio annullare una richiesta non più necessaria, affinché possa evitare coordinamenti non più utili.

Epic #20 | Priorità proposta P2. Storia candidata da approfondire: ruolo, condizioni e transizioni non definiti. Fonti: F07, stato Annullata.

Criteri iniziali. F07 elenca Annullata; il suo uso applicativo è aperto in Q-04/#29. Mancano ruoli, condizioni e stati di partenza: storia non pronta alla costruzione.

Storie candidate comunicazioni

US-D11 Invio di comunicazioni a destinatari selezionati

Come utente Banco, voglio inviare un avviso con allegati a un insieme di OPT, affinché possa distribuire informazioni operative in modo tracciabile.

Epic #22 | Priorità proposta P2. Nuova storia proposta; significato del divieto di broadcast aperto. Fonti: F02 §5.4; F06, 20/10; F08 #22.

Criteri iniziali. Il Banco seleziona i destinatari e invia testo e allegato; soltanto i destinatari consultano la comunicazione. Non si impone ancora un divieto assoluto di selezionare tutte le OPT.

Dipendenze e dubbi. Anagrafica destinatari e gestione allegati; limiti da validare.

US-D12 Conferma di ricezione delle comunicazioni

Come referente OPT, voglio confermare la ricezione di una comunicazione del Banco, affinché possa consentire al coordinamento di conoscere quali riscontri mancano.

Epic #22 | Priorità proposta P2. Nuova storia proposta. Conferma esplicita o tecnica da chiarire; lettura distinta dalla ricezione. Fonti: F06, 20/10; F08 #22.

Criteri iniziali. La conferma riguarda la sola OPT destinataria e viene mostrata al Banco; ricezione e lettura non sono sinonimi. Il gesto o evento che produce la conferma deve essere concordato prima della costruzione.

Dipendenze e dubbi. US-D11 e definizione condivisa del significato della conferma.

Storie candidate rendicontazione

US-D13 Compilazione e invio della scheda trimestrale

Come Operatore interno PICUS o professionista esterno, voglio compilare e inviare al Banco la mia scheda del trimestre, affinché possa rendicontare attività e conteggi con dati uniformi.

Epic #23 | Priorità proposta P2. Nuova storia proposta su capacità confermata. Fonti: F02 §5.5 e appendice B; F07 Scheda trimestrale.

Criteri iniziali. L'operatore compila e invia la propria scheda anche senza richieste PICUS; gli assistiti sono solo conteggi aggregati; categorie sovrapponibili ammesse; il Banco riceve la scheda senza approvazione obbligatoria introdotta.

Dipendenze e dubbi. Accesso personale; schema e controlli da dettagliare.

US-D14 Riepilogo delle schede per la rendicontazione

Come utente Banco, voglio consultare le schede ricevute e ricavarne un riepilogo, affinché possa agevolare l'inserimento manuale nel portale ministeriale.

Epic #23 | Priorità proposta P2. Riepilogo proposto; formato e tracciato di eventuale export da concordare. Fonti: F02 §5.5; F07 Scheda trimestrale; F08 #23.

Criteri iniziali. Il Banco seleziona il trimestre e ritrova le schede ricevute; eventuali aggregati non sommano categorie sovrapposte come insiemi disgiunti. L'inserimento nel portale resta manuale, senza API ministeriali.

Dipendenze e dubbi. US-D13; definizioni delle categorie e regole di aggregazione.

Valutazione INVEST ed esito del raffinamento

La valutazione è preliminare e riguarda le schede proposte. I significa indipendenza, N negoziabilità, V valore, E stimabilità, S dimensione sostenibile e T verificabilità. Le dipendenze tecniche non sono nascoste. La revisione di un altro membro e le stime del team restano da registrare.

Storia	Valutazione motivata
US-25	I: parziale, richiede utenze e posta; N: soglie negoziabili; V: accesso e autonomia; E: stimare dopo policy credenziali; S: login e recupero separabili in costruzione; T: ruoli, link e viewport verificabili.
US-28	I: trasversale, non autonoma da tutte le funzioni; N: meccanismo tecnico negoziabile; V: tutela dei dati; E: per ogni risorsa disponibile; S: applicare a incrementi verticali; T: matrice ruoli e casi negativi.
US-D01	I: parziale, attivazione comune; N: campi negoziabili; V: copre capacità obbligatoria; E: da stimare dopo schema; S: singola organizzazione; T: creazione, duplicati e autorizzazione.
US-27	I: parziale, catalogo e attivazione condivisi; N: campi e soglie negoziabili; V: accesso personale; E: tipi operatore da chiarire; S: revoca estratta, modifica rinviata; T: attivazione e casi negativi espliciti.
US-D05	I: parziale, dipende da IAM e catalogo; N: campi negoziabili; V: avvia il servizio; E: schema da validare; S: sola creazione, coordinamento separato; T: registrazione, errori e visibilità.
US-26	I: parziale, richiede IAM; N: gestione pratiche aperte negoziabile; V: accessi coerenti con convenzione; E: stimabile per la sola revoca; S: una azione amministrativa; T: sessioni negate e storico invariato.
US-D02	I: parziale, riusa IAM; N: pratiche pendenti da discutere; V: accessi coerenti con incarico; E: stimabile per revoca base; S: una azione; T: sessioni, recupero e dati storici.
US-24	I: parziale, riusa account e attivazione; N: schema negoziabile; V: meno lavoro annuale; E: da stimare dopo schema; S: sola importazione, invio posta separabile; T: casi validi, errori e rinnovo annuale.

Esito. US-27 è stata circoscritta a creazione e attivazione; la revoca è separata in US-D02. US-24 resta opzionale e non sostituisce US-D01. US-28 è un vincolo trasversale da verificare sulle risorse realizzate. US-D05 rende esplicito l'avvio del flusso utile, ma richiede la conferma dello schema non identificativo. Nessuna scheda è dichiarata stimata o approvata dal solo completamento del documento.

Storie da approfondire. US-D10 non è pronta alla costruzione finché mancano attori e transizioni dell'annullamento. US-D06 e US-D08 dipendono dai chiarimenti su vicinanza e competenze sull'appuntamento. US-D12 dipende dal significato della conferma di ricezione. Le altre candidate richiedono raffinamento dei criteri e revisione prima della selezione in un'iterazione.

Tracciabilità. MIG-01 collega US-D05 e US-D09; MIG-02 collega US-D04, US-D06 e US-D07; MIG-03 collega US-D06 e US-D07; MIG-04 collega US-D08; MIG-05 collega US-D13 e US-D14. QS-01 e QS-02 attraversano il percorso; QS-03/04 trattano carico e uso mobile; QS-05 il ripristino; QS-06 il catalogo configurabile. Le schede complete sono in A5.

Allineamento del backlog. Conservare la distinzione fra requisiti delle fonti, proposta documentale e decisioni effettivamente recepite nelle issue. Sono rilevanti CSV opzionale, separazione delle funzioni IAM, criteri verificabili e confine del flusso in #29. L'aggiornamento GitHub è svolto in parallelo dal gruppo; la fotografia F08 non ne attesta lo stato finale.

A5 Dati e scenari di qualità

Requisiti sui dati

Oggetto	Informazioni e vincoli iniziali	Questioni e fonte
OPT	Anagrafica organizzativa: nome, indirizzo, codice fiscale, città, codice struttura, numero di assistiti e attività. Proprie informazioni e richieste.	Account unico, email unica e revoca manuale confermati; campi e monitoraggio OPT in Q-13, conservazione in Q-05. F02, F06, F07.
Catalogo	Dodici misure iniziali; aggiornabili dal Banco senza intervento dello sviluppatore.	Gestire come dati; valutare altre classificazioni variabili. F02, §5.2 e app. A.
Erogatori	Operatori interni, professionisti esterni e OPT; territorio e più misure per operatore.	Disponibilità, competenze e conflitti da chiarire. F02, §§2, 5.3 e 8.
Richiesta	Misura per persona o nucleo senza identificativi degli assistiti.	Schema minimo proposto in IP-03 e Q-02. Il confine della richiesta applicativa è aperto in Q-04/#29.
Appuntamento	Presenza: data, ora, luogo e referente. Distanza: data, ora e link video; conferma dell'operatore.	Compatibilità della misura con la modalità remota. F02, §5.3.
Scheda trimestrale	Dati personali e amministrativi dell'operatore; costo orario, ore e conteggi aggregati. Nessun legame obbligatorio con OPT, misura o richiesta.	Sovrapposizione confermata; definizioni e controlli ulteriori in Q-06, perimetro degli operatori in Q-11.
Comunicazioni	Banco verso OPT, anche con allegati.	Canali, notifiche e lettura sono da valutare. F02, §5.4.

Protezione e validazione. PICUS non acquisisce dati identificativi degli assistiti. Le informazioni personali e amministrative degli operatori sono distinte dai conteggi aggregati e protette per ruolo e titolare. Non è previsto che categorie sovrapposte sommino al totale. La revoca dell'accesso e la cancellazione dei dati sono azioni distinte; la politica di conservazione resta da chiarire in Q-05. [F02; F06; F07]

Catalogo degli scenari di qualità

Attività collegata S1-07 (#8). Sei scenari trasformano le esigenze delle fonti in risposte e misure verificabili. Sono specifiche e piani di prova: nessun test prestazionale, di usabilità o di ripristino è dichiarato già eseguito. Le soglie numeriche introdotte dal team sono proposte da validare prima delle prove di costruzione.

ID e area	Priorità proposta	Fonti e collegamenti
QS-01 — Sicurezza	P1	F02 §§3 e 7; US-28; tutte le storie del percorso MVP.
QS-02 — Privacy	P1	F02 §§1, 5 e 7; F06 del 22/10; US-28, US-D05 e US-D13.
QS-03 — Performance	P2	F02 §7; US-D05–US-D09 e, quando disponibile, US-D13.
QS-04 — Usabilità	P1	F02 §§3 e 7; US-25 e US-D05–US-D08.
QS-05 — Disponibilità	P2	F02 §7; richieste del percorso MVP.
QS-06 — Modificabilità	P2	F02 §5.2 e §7; US-D03; catalogo iniziale delle 12 misure.

La priorità P1 riguarda la correttezza del primo percorso; P2 comprende i picchi, il ripristino e la configurabilità da affinare quando i moduli pertinenti sono disponibili. Il catalogo contiene esigenze del prodotto intero: non tutte le prove sono prerequisiti dimostrati del primo MVP. Q-07 raccoglie la validazione del profilo di prova e delle soglie.

QS-01 Isolamento degli accessi

Sicurezza | Priorità proposta P1 | Fonte: F02 §§3 e 7; US-28; tutte le storie del percorso MVP.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un utente OPT o Operatore, autenticato oppure privo di una sessione valida.
Stimolo	Tenta di leggere o modificare una richiesta, un appuntamento o una scheda di un altro titolare, anche alterando l'identificativo inviato al server.
Ambiente	Funzionamento ordinario con due OPT A/B, due Operatori X/Y e un utente Banco; dati sintetici assegnati a titolari distinti. Le prove si aggiungono quando ciascuna risorsa è disponibile.
Artefatto	Controlli di autenticazione, autorizzazione e appartenenza sulle risorse protette.
Risposta	Il server nega gli accessi non consentiti prima di restituire dati o applicare modifiche. La sessione determina ruolo e titolare. Il Banco mantiene la visibilità necessaria al coordinamento.
Misura della risposta	100% dei casi negativi della matrice di prova negati; 0 record estranei restituiti e 0 modifiche non autorizzate. 401 senza autenticazione valida; 403 con identità valida e permesso mancante. Tutti i casi positivi previsti dalla stessa matrice sono consentiti.

Stato delle misure. Vincolo di isolamento dalle fonti; codici e matrice sono la specifica proposta dal team. È un piano di verifica, non un esito già osservato.

Metodo di verifica previsto. Provare UI e richieste dirette al server per ogni combinazione ruolo/titolare/azione. Confrontare i dati prima e dopo i tentativi negati e registrare versione e casi eseguiti.

QS-02 Minimizzazione e riservatezza dei dati

Privacy | Priorità proposta P1 | Fonte: F02 §§1, 5 e 7; F06 del 22/10; US-28, US-D05 e US-D13.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Una OPT che compila una richiesta o un utente che consulta dati degli operatori.
Stimolo	Invia campi identificativi degli assistiti non previsti dallo schema oppure tenta di consultare dati personali di un operatore senza permesso.
Ambiente	MVP con campi strutturati e senza testo libero o allegati relativi agli assistiti; controlli estesi a schede ed export quando introdotti. Dataset di prova interamente sintetici.
Artefatto	Schema dei moduli e delle richieste, validazione sul server, registri applicativi, viste e future esportazioni.
Risposta	PICUS non offre campi anagrafici degli assistiti; rifiuta i campi non ammessi senza riprodurne il contenuto nei log o nei messaggi. Dati personali dell'operatore accessibili solo al Banco autorizzato e all'operatore titolare.
Misura della risposta	0 campi identificativi degli assistiti nel modello e nei contratti. Tutti i payload di prova con campi non ammessi sono respinti senza persistenza o eco del valore. Nessun identificativo di assistito rilevato nei dati, log ed export campionati; 100% degli accessi non consentiti ai dati degli operatori negati.

Stato delle misure. Vincoli di minimizzazione dalle fonti. La verifica dello schema, i campi consentiti e il campione di 20 payload negativi sono proposte del team. Nessuna classificazione automatica universale del testo viene presunta.

Metodo di verifica previsto. Ispezionare schema e contratti; inviare 20 payload negativi sintetici; verificare database, messaggi e log. Applicare la matrice QS-01 ai dati personali degli operatori. Conservazione e cancellazione restano in Q-05.

QS-03 Risposta durante i picchi trimestrali

Performance | Priorità proposta P2 | Fonte: F02 §7; US-D05–US-D09 e, quando disponibile, US-D13.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	OPT, Banco e Operatori che usano contemporaneamente le funzioni disponibili.
Stimolo	Un aumento di consultazioni e invii vicino alla scadenza trimestrale mentre continua il coordinamento delle richieste.
Ambiente	Prova proposta con 50 sessioni concorrenti, 450 OPT e 2.000 richieste sintetiche; aggiungere 100 schede quando il modulo esiste. Due minuti di riscaldamento e 15 minuti di carico. Configurazione, risorse e rete sono registrate prima della prova.
Artefatto	Consultazione delle richieste, invio dei moduli e persistenza; successivamente compilazione delle schede.
Risposta	Le operazioni restano utilizzabili e ogni invio confermato produce un solo record persistito. I rifiuti autorizzativi attesi sono distinti dagli errori del servizio.
Misura della risposta	Soglie proposte: 95° percentile entro 2 secondi per consultazioni ed entro 3 secondi per invii; errori di servizio non oltre l'1%; nessun invio confermato perso o duplicato. Nel profilo esteso: 60% consultazioni, 20% richieste, 20% schede.

Stato delle misure. Carichi e soglie interamente proposti da validare in Q-07. Non sono dedotti dal numero di OPT o dai 230.000 utenti. L'MVP prova il sottoinsieme delle richieste e non dichiara superato il futuro carico sulle schede.

Metodo di verifica previsto. Eseguire un test di carico riproducibile dopo l'implementazione, conservando tempi, errori, profilo e conteggi. Ripetere il profilo esteso quando esiste la rendicontazione; nessun test di carico è dichiarato eseguito in S1.

QS-04 Uso dei flussi principali da smartphone

Usabilità | Priorità proposta P1 | Fonte: F02 §§3 e 7; US-25 e US-D05–US-D08.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un referente OPT con familiarità digitale ordinaria.
Stimolo	Accede, invia una richiesta e consulta i dettagli di un appuntamento già predisposto per la prova.
Ambiente	Viewport di 360 × 800 CSS pixel e dati sintetici; cinque partecipanti rappresentativi, se disponibili. Le attese del Banco e dell'erogatore sono escluse dal tempo delle azioni di interfaccia.
Artefatto	Accesso, modulo di richiesta e consultazione dei propri appuntamenti.
Risposta	L'utente riconosce le azioni, completa il modulo, comprende errori e conferme e ritrova la propria richiesta senza assistenza del facilitatore.
Misura della risposta	Soglie proposte: almeno 4 partecipanti su 5 completano accesso e invio entro 3 minuti e trovano i dettagli predisposti entro 1 minuto, senza aiuto. Nessuno scorrimento orizzontale a 360 CSS pixel; campi, etichette e pulsanti restano raggiungibili.

Stato delle misure. Esigenza mobile dalle fonti; viewport, campione e tempi sono proposte da validare in Q-07. Non è una dichiarazione di conformità a uno standard di accessibilità.

Metodo di verifica previsto. Usare un protocollo con le stesse consegne e registrare tempi, errori e richieste di aiuto. Verificare anche il ridimensionamento su desktop. La prova utenti avverrà su software disponibile, non è simulata nella review S1.

QS-05 Ripristino del servizio dopo un fermo

Disponibilità | Priorità proposta P2 | Fonte: F02 §7; richieste del percorso MVP.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un guasto del processo applicativo o dell'istanza che lo esegue.
Stimolo	PICUS diventa temporaneamente indisponibile dopo che alcune richieste sono state salvate e confermate.
Ambiente	Fermo del servizio con database integro e dati persistiti disponibili. Perdita del database e disastro dell'intera infrastruttura richiedono uno scenario e una politica di backup separati.
Artefatto	Applicazione, connessione alla persistenza e procedura di ripristino.
Risposta	Il servizio viene ripristinato mediante una procedura documentata; gli utenti ritrovano le richieste già confermate e gli invii non riusciti non appaiono falsamente completati.
Misura della risposta	Obiettivo proposto: ripristino entro 4 ore dal fermo, con 100% dei record già confermati ancora disponibili nel caso di database integro. Il tempo è misurato fino al completamento riuscito di accesso, lettura e nuovo invio di prova.

Stato delle misure. F02 tollera alcune ore e, eccezionalmente, un paio di giorni; non stabilisce un SLA. Le 4 ore sono una proposta da concordare in Q-07. Nessuna garanzia sulla perdita del database viene dedotta.

Metodo di verifica previsto. In un ambiente di prova interrompere il solo servizio, eseguire il runbook e confrontare i record prima e dopo. Registrare tempi e limiti quando la procedura di esecuzione sarà disponibile.

QS-06 Modifica del catalogo senza rilascio software

Modificabilità | Priorità proposta P2 | Fonte: F02 §5.2 e §7; US-D03; catalogo iniziale delle 12 misure.

Elemento	Specifica dello scenario
Sorgente	Un utente Banco autorizzato alla gestione del catalogo.
Stimolo	Deve aggiungere una nuova misura o correggere la descrizione di una misura esistente.
Ambiente	Servizio in esecuzione e modulo di gestione catalogo disponibile. L'MVP iniziale usa dati precaricati e non dichiara implementato il relativo modulo amministrativo.
Artefatto	Catalogo configurabile, interfaccia Banco e viste di selezione della misura.
Risposta	Il Banco aggiorna il catalogo tramite l'applicazione; le OPT vedono le nuove informazioni senza intervento dello sviluppatore. Le richieste precedenti conservano il significato della misura scelta.
Misura della risposta	Soglie proposte: operazione completata entro 5 minuti da un utente Banco e visibilità alla OPT al successivo aggiornamento della vista, entro 10 secondi. Nessuna modifica al codice, ricompilazione, riavvio o aggiornamento manuale del database.

Stato delle misure. Configurabilità senza sviluppatore dalle fonti; tempi proposti dal team. Comportamento sulle misure già usate e sulla disattivazione da dettagliare in US-D03.

Metodo di verifica previsto. Partire da un catalogo di prova, aggiungere una misura e modificarne una esistente; verificare con una sessione OPT e con una richiesta storica. Eseguire la prova quando US-D03 è disponibile.

A6 Domande aperte e ipotesi

Attività collegata S1-08 (#9). Il registro conserva gli ID Q-01–Q-08 già usati e aggiunge Q-09–Q-13. Sono selezionati dieci quesiti prioritari per il confronto; tre voci precedenti conservano risposte parziali o soglie da validare. Solo #21 e #29 sono qui attestati come collegamenti GitHub letti in F09. Gli altri quesiti sono proposte documentali da registrare o abbinare al backlog dal gruppo.

Riscontri da preservare. Unico account ed email unica per OPT; revoca manuale e credenziali senza scadenza automatica; ordine cronologico delle richieste; esclusione del personale interno OPT dal censimento individuale; dati identificativi degli assistiti esclusi; scheda trimestrale separata dalle richieste; categorie sovrapponibili. Questi punti non sono riaperti come domande generiche. [F06; F07]

Q-04 Confine della richiesta e stati

PICUS termina il coordinamento quando l'appuntamento è confermato, oppure il Banco deve registrare anche l'avvenuta erogazione? Quali annullamenti devono essere trattati e da chi?

Priorità proposta P1. F07 e proposta #20; domanda GitHub #29, aperta senza risposta alla consultazione della v0.5.

Ipotesi provvisoria. IP-01: Accettata chiude il coordinamento dopo la conferma dell'appuntamento; Completata resta una variante sospesa. Non sono definite transizioni di annullamento.

Impatto e follow-up. TOBE-01A/B, US-D08–US-D10, MVP e criteri di chiusura. Referente proposto: PO per il follow-up con il committente. Risposta non registrata in questa versione.

Collegamento: Domanda #29

Q-09 Responsabilità sull'appuntamento

Il Banco può fissare data e luogo oppure propone e registra dettagli concordati con l'erogatore? Chi dà la conferma finale?

Priorità proposta P1. F07 descrive il coordinamento dei dettagli; F06 del 22/10 limita il Banco alla proposta.

Ipotesi provvisoria. IP-02: il Banco registra una proposta concordata e la pubblica solo dopo conferma dell'erogatore, senza assumere una gestione autonoma della sua agenda.

Impatto e follow-up. TOBE-01B, US-D08 e dimostrazione MVP. Referente proposto: PO con committente ed erogatori. Risposta non registrata in questa versione.

Q-03 Territorio disponibilità e vicinanza

Il divieto di associare OPT per distanza riguarda solo l'abbinamento automatico? Quali rappresentazioni di territorio e disponibilità sono utili al Banco?

Priorità proposta P1. F02 §5.3 e F07 citano vicinanza; F06 del 22/10 contiene un divieto da precisare.

Ipotesi provvisoria. Scelta manuale dell'erogatore da parte del Banco, per misura e informazioni territoriali disponibili; nessun ordinamento automatico per distanza.

Impatto e follow-up. #19, #20, US-D04 e US-D06. Referente proposto: Responsabile analisi con il committente. Risposta non registrata in questa versione.

Q-10 Preferenza fra erogatori

Esiste una precedenza fra operatori interni PICUS, professionisti esterni e OPT erogatrici?

Priorità proposta P2. Domanda presente in F07 senza risposta; appunti F06 non consolidati su questo punto.

Ipotesi provvisoria. Nessuna precedenza obbligatoria; il Banco sceglie manualmente e interpella un erogatore per volta.

Impatto e follow-up. US-D06–US-D07; regole di selezione. Referente proposto: PO con il committente. Risposta non registrata in questa versione.

Q-08 Destinatari e conferma delle comunicazioni

È ammesso inviare lo stesso avviso a tutte le OPT? La conferma richiesta è un gesto esplicito dell'OPT, un riscontro tecnico o una distinta conferma di lettura?

Priorità proposta P2. F06 del 20/10; #21 aperta sul broadcast. La semantica della conferma è un chiarimento aggiuntivo da registrare.

Ipotesi provvisoria. Destinatari selezionati e dicitura conferma di ricezione; nessun divieto assoluto di invio a tutte le OPT viene assunto senza risposta.

Impatto e follow-up. #22, US-D11–US-D12 e diagramma delle comunicazioni, fuori dal primo MVP. Referente proposto: Referente di #9 con il committente. Risposta non registrata in questa versione.

Collegamento: Domanda #21

Q-11 Operatori con accesso e scheda

Quali categorie di operatori interni PICUS ed esterni ricevono un account e inviano la scheda trimestrale? Il personale interno delle OPT resta sempre escluso dal censimento individuale?

Priorità proposta P1. F07 conferma l'accesso personale; alcuni sottoquesiti sulla rendicontazione esterna non hanno risposta esplicita. F06 esclude il personale interno delle OPT.

Ipotesi provvisoria. Account personali per gli erogatori accreditati individuati dal Banco; personale OPT non censito. Il perimetro definitivo della scheda resta da confermare.

Impatto e follow-up. US-27, US-D02, US-D13 e TOBE-02. Referente proposto: Referenti IAM e rendicontazione con il committente. Risposta non registrata in questa versione.

Q-12 Utenze del Banco

Quante persone del Banco useranno l'applicazione e chi crea o revoca le loro utenze?

Priorità proposta P1. F02 attribuisce al Banco funzioni amministrative, ma non definisce il bootstrap dei suoi account.

Ipotesi provvisoria. Per la sola dimostrazione MVP si predispone un account Banco sintetico tramite configurazione iniziale; la politica operativa reale non è data per risolta.

Impatto e follow-up. #18, US-25, avvio della dimostrazione e successiva gestione utenti. Referente proposto: PO con il referente del Banco. Risposta non registrata in questa versione.

Q-13 Informazioni e monitoraggio delle OPT

Quali campi dell'anagrafica OPT sono necessari? Sono richiesti dati quantitativi o una specifica scheda dell'organizzazione, distinta da quella personale dell'operatore?

Priorità proposta P2. F02 §5.2 e §6; F06 del 20/10; punti sospesi di #19.

Ipotesi provvisoria. Solo i campi necessari ad account, misura e territorio; la raccolta quantitativa dell'OPT è rinviata fino a definizione di contenuti e responsabilità.

Impatto e follow-up. US-24, US-D01, #19 e schemi dati. Referente proposto: Referenti catalogo e rendicontazione con il committente. Risposta non registrata in questa versione.

Q-05 Dati dopo la revoca

Quali tempi e regole di conservazione, cancellazione ed eventuale accesso ai dati storici si applicano dopo la revoca di OPT e Operatori?

Priorità proposta P2. F02 §§5.1 e 7–8; F06 conferma revoca manuale e credenziali senza scadenza, non una conservazione illimitata.

Ipotesi provvisoria. La revoca blocca gli accessi e non cancella automaticamente i dati storici. Nessun termine di conservazione è inventato dal team.

Impatto e follow-up. US-26, US-D02, schede e registri; interlocutore privacy. Referente proposto: PO e referente privacy del committente. Risposta non registrata in questa versione.

Q-02 Campi non identificativi della richiesta

Quale insieme minimo di informazioni permette al Banco di lavorare una richiesta senza identificare la persona o il nucleo?

Priorità proposta P1. F02 §5.3 e §8; F06 del 22/10; F07.

Ipotesi provvisoria. IP-03: misura di catalogo, indicazione persona/nucleo e comune scelto da elenco. Nessun testo libero o allegato dell'assistito nel primo MVP.

Impatto e follow-up. US-D05, QS-02 e contratto del modulo di richiesta. Referente proposto: Referenti #20 con il committente. Risposta non registrata in questa versione.

Risposte parziali e validazioni residue

ID e tema	Riscontro e residuo	Momento di riesame
Q-01 — Account OPT e cambio del referente	Risposta parziale: unico account ed email unica per OPT confermati da F06/F07. Resta da precisare la continuità al cambio di referente; non si riapre il numero degli account.	Recupero e gestione del referente: dettaglio da consolidare in S2.
Q-06 — Definizioni della scheda e controlli	Risposta parziale: categorie sovrapponibili confermate da F07. Restano regole su ore, periodo, totali e correzioni; nessuna somma obbligatoria delle categorie al totale.	Prima di implementare US-D13 e l'aggregazione.
Q-07 — Carichi e soglie di qualità	Aperta: le esigenze sono nelle fonti; 50 sessioni, viewport 360, tempi e ripristino di 4 ore sono proposte dei sei QS, non misure eseguite o SLA concordati.	Validare priorità e soglie prima delle prove in costruzione.

Una risposta parziale conserva aperto il solo sottoquesito residuo. Q-04 non è presentata come definitivamente risolta: la proposta di processo oggi discussa nella #29 richiede di riconciliare l'uso degli stati con F07.

Registro delle ipotesi provvisorie

ID	Ipotesi	Riesame e conseguenza
IP-01	Chiusura del coordinamento come Accettata solo dopo conferma dell'appuntamento; Rifiutata quando non si trova soluzione. Nessuna gestione dell'esito della prestazione nel flusso principale.	Proposta temporanea collegata a Q-04 / #29. Riesaminare alla risposta; se serve Completata, aggiornare stati, TOBE-01B, US-D09 e MVP.
IP-02	Il Banco registra dettagli concordati e attende conferma dell'erogatore prima della pubblicazione.	Proposta collegata a Q-09. Non attribuisce al Banco il potere autonomo di fissare l'agenda.
IP-03	Richiesta strutturata con misura, persona/nucleo e comune; assenza di testo libero e allegati degli assistiti nel primo MVP.	Proposta collegata a Q-02 e QS-02. Aggiornare lo schema alla validazione dei campi.
IP-04	Utenti, catalogo iniziale e offerta precaricati come dati sintetici per la dimostrazione.	Prerequisito tecnico del prototipo; gestione completa degli account e dell'offerta non è dichiarata implementata. Q-12 per le utenze reali del Banco.
IP-05	Il dato 230.000 utenti non viene usato per dimensionare account o concorrenza.	Significato e periodo da chiarire. Le soglie di QS-03 restano un profilo di prova proposto.
IP-06	Non si introducono timeout, priorità di urgenza, assegnazione automatica per distanza o ordine obbligatorio fra erogatori.	Ordine cronologico confermato per le richieste; altre regole richiedono Q-03/Q-10 e confronto con il committente.

Le ipotesi non equivalgono a requisiti concordati. Si riesaminano alla risposta pertinente e prima della selezione del lavoro di costruzione. Registrare risposta, autore del chiarimento, data e modifiche risultanti; nessuna risposta o approvazione viene simulata.

A7 Proposta di MVP

Attività collegata S1-09 (#10). Proposta del 25/10/2026, da discutere e ordinare con il PO. Il primo MVP permette a una OPT di ottenere un appuntamento confermato tramite il coordinamento del Banco, con accessi isolati e nessun identificativo degli assistiti. La proposta usa IP-01 e IP-02 e resta subordinata ai chiarimenti Q-04/#29 e Q-09.

Valore e confine. La OPT ritrova richiesta ed esito; il Banco consulta una coda e raccoglie risposte senza ricostruirle da canali separati; l'erogatore risponde alle richieste e conferma i dettagli. L'obiettivo del percorso proposto è il coordinamento fino all'appuntamento, non la gestione dell'erogazione. Una diversa risposta a #29 modifica questo confine.

Sette tagli funzionali proposti

Storia o taglio	Contributo al percorso	Prerequisiti e limiti
MVP-01 / US-25	Accesso con email e password ai ruoli Banco, OPT e Operatore.	Taglio proposto della storia #25: il recupero password è separabile e rinviato. Completare il solo login non equivale a chiudere tutta la issue.
MVP-02 / US-28	Autorizzazione per ruolo e titolare su tutte le risorse del percorso.	QS-01 e QS-02; controlli sul server con casi positivi e negativi.
MVP-03 / US-D05	Invio di una richiesta valida con ID, data e In programmazione.	IAM, catalogo precaricato e schema IP-03. Errori e campi non ammessi non creano record.
MVP-04 / US-D06	Consultazione della coda e scelta manuale dell'erogatore con inoltro della richiesta di disponibilità.	Offerta precaricata; nessuna selezione automatica per vicinanza o priorità presunta.
MVP-05 / US-D07	Risposta del destinatario e nuova ricerca dopo un rifiuto.	Il rifiuto del singolo erogatore è distinto dal rifiuto finale della richiesta.
MVP-06 / US-D08	Proposta, conferma e pubblicazione dei dettagli dell'appuntamento.	IP-02 / Q-09; in presenza data, ora, luogo e referente; a distanza data, ora e link.
MVP-07 / US-D09	Chiusura del coordinamento come Accettata o Rifiutata e consultazione dell'esito da parte della OPT.	IP-01 / #29: proposta da validare. Completata e annullamenti non sono tacitamente definiti.

Il conteggio indica sette tagli funzionali da abbinare alle issue operative. US-25 è inclusa per l'accesso: il recupero password può essere separato. Gli ID US-Dxx rimangono quelli del catalogo documentale; non attestano la creazione o il completamento delle corrispondenti issue.

Prerequisiti ed esclusioni

Prerequisiti della dimostrazione. Account sintetici per Banco, due OPT e almeno un Operatore; catalogo iniziale delle 12 misure e offerta compatibile con i casi di prova. Sono dati iniziali del prototipo, non una dichiarazione che l'amministrazione completa degli account e del catalogo sia realizzata. Configurazione, credenziali dimostrative e procedura di caricamento devono essere documentate in costruzione.

Funzioni rinviate	Motivo e condizione
Gestione completa utenze, revoche, CSV e recupero password	Il primo percorso usa account di prova predisposti. Creazione e revoca restano capacità del prodotto, da pianificare prima dell'uso operativo; il CSV rimane opzionale.
Modifica del catalogo e dichiarazione dell'offerta tramite interfaccia	Catalogo e offerta sono dati iniziali della dimostrazione; US-D03 e US-D04 vengono introdotte in un incremento successivo.
Schede trimestrali, aggregati ed export	Processo autonomo rappresentato da TOBE-02, successivo al primo MVP del coordinamento. Non serve per chiudere una richiesta.
Comunicazioni istituzionali e conferma di ricezione	Epic #22 separata dal percorso di richiesta; Q-08 / #21 da chiarire.
Esito della prestazione e annullamenti	F07 rimane la fonte dell'alternativa Completata/Annullata. L'esclusione è una proposta temporanea del team, subordinata a #29; una risposta diversa cambia il taglio MVP.
Geolocalizzazione automatica, urgenze, timeout e piattaforma video interna	Scelta dell'erogatore manuale, coda cronologica e link esterno alla videochiamata sono sufficienti alla proposta. Non vengono introdotti requisiti non concordati.

Rischi e apprendimento. Verificare se campi minimi e dettagli dell'appuntamento sono sufficienti al lavoro reale; se la risposta asincrona è comprensibile; se il Banco deve osservare anche l'esito della prestazione. La risposta a #29 cambia la chiusura, quella a Q-09 la conferma dei dettagli. Le soglie QS non sono garanzie già dimostrate.

Dimostrazione e criteri di riuscita

N.	Azione prevista	Riscontro osservabile
1	OPT A accede e invia una richiesta sintetica valida.	Ottiene ID, data e In programmazione; il Banco ritrova la stessa richiesta in ordine cronologico.
2	Il Banco consulta un primo erogatore, che rifiuta.	Il rifiuto è visibile al Banco; la richiesta originaria resta In programmazione.
3	Il Banco interpella un secondo erogatore, che conferma disponibilità.	La risposta non chiude ancora la richiesta come Accettata.
4	Banco ed erogatore concordano e confermano i dettagli secondo IP-02.	La OPT vede solo l'appuntamento della propria richiesta; lo stato diventa Accettata dopo pubblicazione dei dati confermati.
5	In una seconda richiesta nessun erogatore è disponibile.	Il Banco registra Rifiutata e la OPT ne vede il motivo; nessun contatto con l'assistito avviene in PICUS.
6	OPT B tenta di consultare la richiesta di A; si invia anche un modulo con campi non ammessi.	Accesso estraneo negato e nessuna modifica; il payload non ammesso non crea record e non viene riprodotto nei log.

Qualità minima del primo incremento. Prima di considerare dimostrato il percorso, verificare isolamento e dati con QS-01/QS-02 e le azioni mobile con il protocollo di QS-04. QS-03 valuta il carico del sottoinsieme disponibile; il profilo trimestrale completo richiede il modulo schede. QS-05 richiede una procedura reale di ripristino; QS-06 sarà verificato con la gestione catalogo.

Stato della proposta. La selezione è redatta e verificabile, non ancora approvata dal team né implementata. In S1 la dimostrazione è una spiegazione del percorso con i diagrammi; la demo software e i risultati delle prove appartengono alla costruzione. Il walking skeleton tecnico può precedere questo MVP, ma il solo login non ne realizza il valore per le OPT.

A8 Architettura e decisioni tecniche

Il team adotta una web application MVC come monolite modulare, predisposto all'estrazione di un sottosistema in microservizio gRPC nelle iterazioni finali. Questa è una decisione tecnica del gruppo; i confini concreti dei moduli e il componente da estrarre sono ancora da definire. Non attesta una soluzione già implementata. [F03–F04]

Stack adottato

Componente	Scelta e precisazioni
Linguaggio e build	Java 25 e Maven con wrapper.
Backend	Spring Boot, Spring Web MVC, Spring Data JPA con Hibernate e Jakarta Bean Validation.
View	HTML5, CSS3, JavaScript vanilla e template lato server; Thymeleaf è un'opzione da confermare.
Persistenza	MySQL; accesso confinato al modulo tramite repository.
Verifiche	JUnit 5, oggetti reali e Fake/Stub manuali; nessun Mockito.
Comunicazione futura	gRPC e Protocol Buffers per il sottosistema estratto; contratti ancora da definire.
Esecuzione prevista	Docker e Docker Compose; predisposizione a Kubernetes, senza dichiarare un cluster già realizzato.
Modellazione	Visual Paradigm; ADR per decisioni significative e allineamento tra UML, Javadoc e codice.

Responsabilità MVC

Parte	Responsabilità e limite
Controller	Routing HTTP, deserializzazione, validazione e delega all'applicazione; nessuna regola di business.
Application e Domain	Orchestrazione dei casi d'uso, stato e regole di dominio; nessuna dipendenza da HTTP o template.
View	Rendering e interazione; nessuna valutazione delle regole di business o manipolazione delle entità.
Persistenza	Repository, mapping JPA e accesso MySQL entro i confini del modulo.

Le entità JPA non sono input o output dei Controller né vengono consegnate alle View. Usare DTO con i soli dati necessari al ruolo. Le aree funzionali dell'analisi restano separate dalla scelta dei moduli architetturali.

Confini modulari e qualità

Le collaborazioni tra moduli passano attraverso interfacce dedicate e DTO immutabili, preferibilmente record con tipi standard e senza grafi ciclici o proxy Hibernate. Evitare relazioni JPA e chiamate a repository tra moduli differenti. Adapter e Facade consentiranno di sostituire una chiamata locale con un client gRPC senza diffondere dettagli del trasporto nel dominio. [F03–F04]

Usare constructor injection e dipendenze espresse da interfacce nei confini. Validare input e precondizioni; tradurre gli errori al confine applicativo senza ignorarli. Autorizzazione per ruolo e appartenenza deve essere verificata sul server, compresi errori e percorsi alternativi.

Configurazione esterna tramite proprietà e variabili d'ambiente; nessuna credenziale hardcoded. Non memorizzare file persistenti o stato di sessione sul filesystem dei container. Gli eventuali allegati richiedono storage esterno. L'architettura di deployment va documentata con ciò che è effettivamente eseguibile.

GRASP e pattern GoF

Assegnare responsabilità secondo Information Expert, Creator, Controller, Low Coupling, High Cohesion, Polymorphism, Pure Fabrication, Indirection e Protected Variations. La motivazione deve mostrare il problema risolto e le conseguenze, evitando logica procedurale concentrata in servizi molto estesi.

Riferimenti GoF	Problema da valutare nel progetto
Strategy e State	Variazioni di algoritmi o regole e transizioni di stato; applicazioni concrete da motivare.
Factory Method e Builder	Creazione complessa quando i requisiti lo giustificano.
Observer	Eventi e collaborazioni da disaccoppiare.
Adapter e Facade	Confini tra moduli, tecnologie o sistemi esterni.
Decorator	Responsabilità dinamiche quando preferibili ad alternative più semplici.

Questi pattern sono riferimenti adottati dal team, non componenti tutti già realizzati o da aggiungere artificialmente. Per ogni partecipazione effettiva annotare nel Javadoc di classe il pattern e il ruolo e aggiornare UML e ADR.

Viste e contratti da introdurre

Moduli e dipendenze *Da definire nella baseline: responsabilità, dati posseduti, dipendenze ammesse, interfacce e driver QS.*

Diagrammi e gRPC *Collegare viste essenziali e sequenze dei flussi selezionati; scelta del sottosistema, contratti e verifiche dopo la decisione del team.*

Scheda riutilizzabile di Architecture Decision Record

Identità *ADR da assegnare; titolo; stato proposto, adottato o superato; data; partecipanti alla decisione.*

Contesto *Problema concreto, vincoli e qualità coinvolte; fonti, US e QS pertinenti.*

Alternative *Opzioni realistiche considerate, inclusa la soluzione più semplice quando applicabile.*

Decisione e motivazione *Scelta adottata dal team e ragioni rispetto ai driver; non presentare proposte come decisioni.*

Conseguenze *Benefici, costi, rischi, limiti e condizioni che richiedono riesame.*

Applicazione *Moduli, interfacce, classi e pattern coinvolti; ruoli GRASP/GoF; link UML e codice quando esistono.*

Verifica *Evidenze o esperimenti che sostengono la decisione; esito effettivo e limitazioni.*

Evoluzione *ADR sostituiti o collegati; motivo del cambiamento e artefatti aggiornati.*

Registro delle decisioni da mantenere

Decisione	Stato attuale	Prossimo dettaglio
MVC e monolite modulare	Adottata dal team.	Motivare rispetto ai driver e definire i confini.
Stack e test senza Mockito	Adottati dal team.	Documentare configurazione e verifiche effettive nella costruzione.
Estrazione gRPC	Direzione adottata; componente non selezionato.	Scegliere il confine e motivare il costo della separazione.
Moduli e pattern concreti	Da definire.	Progettazione incrementale e ADR pertinenti.
Motore di template	Da confermare.	Valutare e registrare la scelta del team.

A9 Incrementi verifiche ed esecuzione

Nella preparazione non è richiesta l'implementazione. Questo capitolo è predisposto per le iterazioni di costruzione: non contiene attestazioni di funzionalità consegnate o test superati. Il dettaglio va compilato con riferimenti a codice, versioni e prove effettive. [F01, slide 4–9]

Registro degli incrementi

Versione e iterazione	Comportamento disponibile	Evidenze e limiti
Da compilare nella costruzione	US e AC soddisfatti; percorso dimostrabile; componenti interessati.	Versione del codice, test, demo e limiti residui.

Strategia di verifica adottata

Testare con JUnit 5 il dominio e i pattern usando oggetti reali. Per servizi e Controller usare Fake, Stub o Spy scritti a mano e injection tramite costruttore. Le verifiche di persistenza e wiring usano contesti Spring reali e database di test. Mockito non è ammesso. [F03]

Collegare le prove ai criteri delle storie e ai rischi. Usare, quando utili, partizioni di equivalenza, valori limite, alternative ed errori. Category Partition e analisi strutturale sono tecniche da motivare sul codice effettivo; non si ereditano conteggi di cammini o test dal precedente elaborato.

Ogni correzione di bug richiede un test di regressione che abbia mostrato il difetto prima della correzione. Quando esistono Maven e wrapper, eseguire .\mvnw.cmd test su Windows o ./mvnw test sugli altri ambienti; registrare esito, versione e limiti. La sola revisione documentale non richiede un test Maven.

Scheda riutilizzabile della verifica

ID e collegamenti *T da assegnare; US e AC o QS; tipo di prova; versione del caso.*

Precondizioni input e procedura *Dati dimostrativi non identificativi degli assistiti; ruolo; stato iniziale e passi riproducibili.*

Risultato atteso *Comportamento osservabile derivato dal criterio; nessun esito presunto.*

Ambiente versione e data *Sistema, configurazione rilevante, riferimento del codice e data effettiva.*

Risultato osservato ed esito *Non eseguito. Compilare soltanto dopo la prova: superato, fallito o bloccato con motivazione.*

Evidenza e difetto *Log depurato da dati sensibili, report, screenshot o altra prova; eventuale issue e riesecuzione.*

Istruzioni riproducibili e deployment

Compilare questa scheda quando esiste un incremento eseguibile. Distinguere ambiente previsto, configurazione presente e verifica realmente svolta; non dichiarare operativo Docker, gRPC o Kubernetes in assenza di evidenze.

Voce del runbook	Contenuto da mantenere
Prerequisiti	Versioni effettivamente supportate di Java, Maven Wrapper, MySQL e Docker se usato.
Configurazione	Variabili necessarie, esempi privi di segreti e distinzione fra sviluppo e test.
Avvio	Comandi verificati, directory di esecuzione e dipendenze da avviare prima.
Dati dimostrativi	Procedura di caricamento con operatori fittizi e nessun identificativo di assistiti.
Accessi dimostrativi	Ruoli disponibili e modalità sicura per ottenere credenziali; nessun segreto pubblico.
Verifica	Comandi e scenari di controllo; risultato atteso ed evidenza della prova.
Arresto e ripristino	Procedura, persistenza esterna e limiti conosciuti.
Deployment effettivo	Componenti, reti, storage e configurazione; separare le predisposizioni future.

Coerenza tra prodotto e documentazione

Aggiornare responsabilità dei moduli, diagrammi, Javadoc dei pattern, ADR, storie e scenari interessati quando cambia il software. Non equiparare un modello concettuale a uno schema JPA o a una struttura fisica del database senza una decisione progettuale motivata.

Verifica di riproducibilità *Da registrare: revisore, ambiente pulito, versione, data, istruzioni seguite e problemi riscontrati.*

B1 Team e collaborazione

Membro	GitHub	Responsabilità Scrum
Antonio Caprio	@CapHello	Product Owner e referente
Gianluca Cinquegrana	@giallo04	Developer
Salvatore Di Costanzo	@salvatoredc04	Scrum Master
Alessandro Fontana	@AlessandroFontana04	Developer
Christian Formicola	@Darkessence97	Developer
Manuel Fornataro	@man-for04	Developer
Giovanni Fragola	@giob22	Developer
Roberta Giovengo	@bobby273	Developer

Il PO rende chiari obiettivi e valore e ordina il Product Backlog. I Developers selezionano con il PO un lavoro sostenibile e organizzano il piano dello Sprint. Lo Scrum Master facilita l'efficacia del processo e la rimozione degli impedimenti. Chi ricopre PO o Scrum Master e contribuisce all'incremento partecipa a quel lavoro come Developer; non servono assegnazioni permanenti dei casi d'uso. [F05]

Repository e integrazione

Repository Pinguini alla Fragola Progetto SAD

GitHub Project Progetto SAD

La repository è pubblica e il PO ha confermato le protezioni. Visibilità del Project e visibilità della repository sono indipendenti. Nei file, nelle issue e negli allegati pubblici non inserire segreti o dati personali reali; gli esempi degli operatori sono fittizi. [F04]

I membri del team lavorano su branch dedicati e integrano con Pull Request e review, nel rispetto delle protezioni. I commit umani seguono Conventional Commits. Gli agenti preparano modifiche soltanto su un nuovo branch locale per attività: niente commit, push, pubblicazione, Pull Request o attribuzioni da autore o coautore. [F03]

Integrazione del Word Concordare redazione o coauthoring per evitare versioni binarie concorrenti. Per ogni review conservare la snapshot presentata e registrare l'evoluzione senza riscrivere retroattivamente gli esiti.

Configurazione operativa del GitHub Project

Riferimento della configurazione Sintesi condivisa dal gruppo in F04. Controllare i valori nel Project quando si produce una snapshot; non rappresenta una verifica live delle issue.

Elemento	Convenzione del team
Label	type:epic, type:story, type:task, type:question; blocked quando esiste un impedimento esplicitato.
Status	Backlog → Ready → In progress → In review → Done.
Priority	P1 Alta, P2 Media, P3 Bassa.
Ordine	Numero crescente, per esempio 10, 20, 30, per ordinare precisamente il backlog.
Iteration	S1 Preparazione e S2 Costruzione 1 configurate; iterazioni seguenti da verificare nel Project.
Assignees e Milestone	Assegnatari effettivi concordati nel planning e scadenza dell'iterazione; non assegnare automaticamente ogni issue a tutto il gruppo.

Vista	Filtro e organizzazione
Product Backlog	Tabella; label:"type:story"; Ordine crescente.
Sprint 1 Preparazione	Board; iteration:"S1 - Preparazione"; colonne per Status.
Domande al committente	Tabella; label:"type:question"; priorità alta per prima.

Le viste mostrano gli stessi elementi con filtri diversi: non duplicare le issue per inserirle in più viste. Ready è una convenzione del gruppo, non un gate obbligatorio di Scrum. Una task S1 conclusa documenta un risultato di analisi, senza rendere Done l'implementazione della storia.

Eventi e aggiornamenti

Nel planning chiarire obiettivo, capacità disponibile e lavoro selezionato. Durante lo Sprint aggiornare il piano e far emergere gli impedimenti. Il Daily serve ai Developers per ispezionare e adattare il lavoro, senza richiedere trascrizioni integrali nel Word. Nella Review discutere risultati e prossimi adattamenti del prodotto; nella Retrospective scegliere miglioramenti del modo di lavorare. [F05]

B2 Calendario e criteri di completamento

Iterazione	Periodo ufficiale 2026	Obiettivo e review
S1 Preparazione	15 ottobre – 5 novembre	Analisi, backlog, qualità e proposta MVP. Review 5 novembre.
S2 Costruzione 1	5 – 19 novembre	Baseline architetturale, ADR e walking skeleton. Review 19 novembre.
S3 Costruzione 2	19 novembre – 3 dicembre	Primo flusso funzionale significativo. Review 3 dicembre.
S4 Costruzione 3 e finalizzazione	3 – 17 dicembre	Incrementi, verifiche, consolidamento e preparazione dell'esame. Review 17 dicembre.

Fonte: F01, slide 11. Le etichette S1–S4 sono usate qui per continuità; verificare i nomi effettivi in GitHub. La review chiude un periodo didattico e apre il successivo. Il campo Iteration può mostrare intervalli inclusivi che terminano il giorno precedente.

La preparazione di tre settimane è la fase didattica prevista dal corso. Le iterazioni di costruzione seguono la cadenza di due settimane e integrano analisi, progettazione, implementazione e test. La preparazione non richiede software funzionante. [F01, slide 3–7]

Criteri per gli artefatti preparatori

Checklist proposta da concordare con il gruppo per la chiusura delle task S1. Non sostituisce la Definition of Done dell'incremento software.

Criterio	Evidenza richiesta
Fonte e stato	Riferimenti puntuali; fatti, proposte, ipotesi e domande distinti.
Coerenza	Terminologia e responsabilità allineate fra contesto, processi, storie, qualità e MVP.
Verificabilità	Criteri osservabili e scenari con misure; soglie proposte esplicite.
Tracciabilità	ID e collegamenti alle issue e agli artefatti; versione e data.
Revisione	Controllo del gruppo con revisore, punti aperti ed esito reale registrati.
Consegna	Output leggibile, accessibile al team e collegato alla task; integrazione nella snapshot della review.

Definition of Done per gli incrementi software

Proposta iniziale da concordare prima della costruzione e riesaminare quando necessario. La DoD descrive la qualità comune dell'incremento; i criteri di accettazione descrivono il comportamento della singola storia. Non dichiarare consegnato un incremento che non soddisfa la DoD. [F05]

Aspetto	Criterio proposto
Funzionalità	Comportamento integrato e criteri delle storie verificati con evidenze.
Qualità	Misure degli scenari pertinenti soddisfatte; esiti e limiti della verifica documentati.
Architettura	Rispetto di MVC, confini modulari e DTO; pattern motivati e responsabilità coerenti.
Verifiche	Test significativi con JUnit 5; controlli pertinenti eseguiti; per bug, regressione osservata prima della correzione.
Sicurezza e dati	Autorizzazioni anche per appartenenza; input validati; nessun identificativo degli assistiti o segreto nelle evidenze pubbliche.
Review e documentazione	Review tecnica effettuata; diagrammi, ADR, tracciabilità e istruzioni aggiornati.
Riproducibilità	Incremento avviabile e dimostrabile con configurazione e dati di esempio documentati.

Adozione della DoD *Da concordare: versione, data, partecipanti, modifiche e verifica dell'applicazione.*

Ready e pratiche facoltative

Il gruppo può usare Ready per segnalare lavoro sufficientemente chiaro, con valore, criteri e dipendenze compresi. Una Definition of Ready, gli story point o il burndown sono pratiche facoltative. Epic, User Story e INVEST sono strumenti richiesti o indicati dal corso, senza trasformarli in tutti gli artefatti formali di Scrum. [F01, slide 21–23; F05]

Accettazione e feedback Il committente chiarisce e discute il prodotto; la Review non è un semplice controllo finale di documenti. Registrare il feedback reale e le conseguenze sul backlog. La Retrospective riguarda invece il modo di lavorare e le azioni del gruppo.

C1 Registro della preparazione

Periodo e review. 15 ottobre–5 novembre 2026; Sprint Review del 5 novembre con presentazione di 10 minuti. [F01] Questo registro distingue proposta di piano, artefatti disponibili e attività che devono ancora avvenire.

Sprint Goal proposto. Documentare un flusso PICUS verificabile dalla richiesta all'appuntamento, con backlog ordinabile, sei scenari misurabili e domande tracciate, per presentare un MVP motivato nella review del 5 novembre. La ratifica del team nel planning non è attestata.

Redazione proposta. Un unico integratore del Word fino alla review, proposto nel PO @CapHello e da confermare nel gruppo, raccoglie i contributi e aggiorna Word, PDF e immagini dalla stessa versione. Le revisioni sono svolte da un altro membro e registrate con data ed esito. La proposta evita integrazioni parallele del file binario; non attesta una nomina già avvenuta.

Capacità e responsabilità. Il piano sotto è una proposta, non una rilevazione di disponibilità del team. Le assegnazioni operative e i successivi aggiornamenti sono nel Project; non si inventano ore disponibili o un planning già svolto. Referenti da coinvolgere: #4 per il processo, #8 per QS, #9 per i chiarimenti, #10 per MVP e #11 per la review.

Piano proposto fino alla review

Quando	Risultato proposto	Responsabilità e verifica
26–28/10	Revisionare i to-be, le sei schede QS e il perimetro MVP; raccogliere i dubbi prioritari.	Referenti #4, #8 e #10; revisore diverso dall'integratore.
29–30/10	Portare le domande al committente se è disponibile; recepire le risposte oppure mantenere le ipotesi esplicite.	PO e referente #9; nessun incontro viene attestato come già fissato.
02–03/11	Riesame incrociato di Word, diagrammi e backlog; aggiornare collegamenti, fonti e motivi degli incompleti.	Team; integrazione Word proposta al PO, allineamento GitHub in parallelo.
04/11	Preparare le slide dalla scaletta e svolgere una prova cronometrata di 10 minuti.	Referente #11 e team; registrare durata e azioni solo dopo la prova.
05/11	Sprint Review con artefatti disponibili, proposte, dubbi e lavoro residuo dichiarati.	Team; feedback e conseguenze registrati dopo l'evento.

Stato degli artefatti per S1

Consegna	Evidenza disponibile nella v0.5	Passaggio residuo
Stakeholder e contesto	A1–A2 e CTX-01 v0.3.	Revisione del gruppo e aggiornamento delle decisioni che emergono dal confronto.
As is e to be	ASIS-01A/B e TOBE-01A/B/02 in Mermaid con esportazioni e note sulle ipotesi.	Validare la ricostruzione e discutere Q-04/#29 e Q-09; nessuna approvazione presunta.
Epic e storie	A4: cinque Epic, 19 storie documentali, otto schede dettagliate e INVEST.	Abbinare ID locali alle issue aggiornate, ordinare col PO, stimare nel team e revisionare.
Qualità	A5: QS-01–QS-06 con sei elementi, misure e metodi.	Concordare soglie e svolgere le prove quando esiste l'implementazione.
Domande e ipotesi	A6: dieci quesiti prioritari, tre voci residue e IP-01–IP-06.	Registrare le domande operative e le risposte effettive; aggiornare gli artefatti interessati.
MVP	A7: sette tagli funzionali, prerequisiti, esclusioni e percorso di dimostrazione.	Discussione e selezione del team; risposta ai dubbi che ne cambiano il confine.
Presentazione	Scaletta di 10 minuti riportata sotto.	Produrre le slide e fare la prova; nessuna presentazione o prova è dichiarata già svolta.

Criterio di chiusura documentale. Un altro membro verifica fonti, coerenza dei termini e corrispondenza fra diagrammi, storie, QS e MVP; i criteri delle task si segnano soltanto per i risultati effettivamente raggiunti. Il completamento delle proposte qui redatte non attesta software implementato o qualità già misurata.

Scaletta della presentazione di 10 minuti

Tempo	Argomento	Messaggio ed evidenza
0:00–1:00	Problema e confini	Banco, OPT, Operatori; assistiti senza account e nessuna integrazione ministeriale.
1:00–3:00	As is e criticità	ASIS-01A/B; informazioni frammentate e passaggi manuali, senza tempi inventati.
3:00–5:00	To be proposto	TOBE-01A/B e TOBE-02; miglioramenti MIG; alternativa del ciclo di vita esplicita in #29.
5:00–7:00	Backlog e MVP	Cinque Epic, catalogo delle storie e sette tagli funzionali del primo percorso, inclusioni ed esclusioni.
7:00–8:00	Qualità	Sei QS, con una misura concreta di sicurezza e una di performance; soglie proposte, prove da eseguire in costruzione.
8:00–9:00	Domande e ipotesi	Q-04/#29 e gli altri quesiti che cambiano il processo; nessuna risposta presunta.
9:00–10:00	Stato effettivo e passi successivi	Artefatti prodotti, revisioni ancora da fare, allineamento del backlog e selezione successiva in planning.

Prova proposta per il 4 novembre. Un relatore percorre la scaletta mentre un altro membro misura il tempo. Registrare durata effettiva, passaggi poco chiari, correzioni e nuova prova se necessaria; obiettivo di 10 minuti. Gli interventi possono essere ripartiti fra i membri dopo accordo del gruppo, senza assegnazioni inventate.

Materiale da mostrare. Un esempio sintetico di richiesta, i due esiti di coordinamento, un rifiuto seguito da un'alternativa, il confronto con l'as-is, due misure QS rappresentative e le domande che cambiano il processo. La rendicontazione resta un processo separato e la #29 è dichiarata aperta fino a una risposta.

Registrazione degli eventi ancora futuri

Review del 5 novembre: non ancora svolta. Dopo l'evento registrare versione presentata, partecipanti effettivi, osservazioni ricevute, decisioni e conseguenze sul backlog. Non vengono compilati feedback o approvazioni fittizi.

Retrospective: da svolgere separatamente dalla review. Registrare un problema concreto del modo di lavorare e un'azione con responsabile, termine e verifica dopo la discussione del team. L'allineamento fra Word e GitHub è un possibile tema, non un esito già deliberato.

Passaggio alla costruzione. Nel successivo planning riesaminare Q-04/#29 e Q-09, selezionare un insieme sostenibile di storie e definire il primo incremento tecnico. Architettura, esiti dei test, deployment e decisioni delle iterazioni future saranno documentati quando effettivamente disponibili.

C2 Registro della costruzione 1

Periodo e review 5 – 19 novembre 2026; review 19 novembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Definire la baseline architetturale e realizzare un walking skeleton funzionante.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Driver QS, responsabilità e dipendenze dei moduli, viste essenziali, persistenza, prime decisioni ADR e runbook verificato. Aggiornare A4–A9 e tracciabilità.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

C3 Registro della costruzione 2

Periodo e review 19 novembre – 3 dicembre 2026; review 3 dicembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Realizzare il primo flusso funzionale significativo e integrarlo con quanto disponibile.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Storie selezionate, progettazione e codice pertinenti, verifiche funzionali e di qualità, evoluzione dei moduli e dei pattern, istruzioni riproducibili. Aggiornare prodotto e backlog.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

C4 Registro della costruzione 3

Periodo e review 3 – 17 dicembre 2026; review 17 dicembre. [F01, slide 11]

Obiettivo didattico Integrare ulteriori capacità, verificare l'architettura e consolidare la versione per l'esame.

Sprint Goal concordato *Da definire nel planning con relazione al Product Goal; l'obiettivo didattico non sostituisce lo Sprint Goal del team.*

Pianificazione e capacità *Data, partecipanti, disponibilità, US selezionate con link, criteri precisati, piano e dipendenze.*

Contenuti da aggiornare Nuovi incrementi, eventuale estrazione gRPC secondo le decisioni del team, evidenze di verifica, qualità, limiti residui, riproducibilità e demo finale. Distinguere predisposizioni e realizzazioni.

Lavoro e variazioni *Output reali, ostacoli, modifiche motivate al piano e decisioni o ADR aggiornati.*

Incremento ed evidenze *Comportamento dimostrabile; versione del codice; US, AC e QS verificati; esiti e limiti della DoD.*

Completati e incompleti *Elencare elementi selezionati, stato effettivo, motivi, evidenze e gestione del lavoro residuo.*

Review *Data e snapshot; demo; feedback reale; adattamenti del backlog e attività successive.*

Retrospective *Data; osservazioni sul lavoro; azione scelta, responsabile, termine e criterio di verifica.*

Riesame delle azioni precedenti *Riscontro delle azioni della Retrospective precedente; mantenere gli esiti reali.*

Rischi e prossimo planning *Questioni, dipendenze e informazioni necessarie; nessuna selezione futura data per già concordata.*

D1 Tracciabilità e diagrammi

La matrice collega fonti e bisogni a ciò che viene discusso, progettato e verificato. Compilarla progressivamente con ID stabili; un collegamento a codice o prova si aggiunge quando esiste, senza anticipare evidenze.

Fonte o bisogno	Storie scenari e processo	Verifica prevista e stato
Privacy e isolamento F02/F06	US-28, US-D05; QS-01/QS-02; TOBE-01A/B.	Matrice ruoli e payload negativi in costruzione; nessun risultato software dichiarato.
CR-01/03, richiesta coordinata	US-D05–US-D09; MIG-01/03; TOBE-01A/B; MVP-03–07.	Percorso dimostrativo di A7; confine in IP-01 / Q-04/#29.
CR-02/04, erogatore e dettagli	US-D06–US-D08; MIG-02/04; TOBE-01A/B; QS-04.	Caso di rifiuto, alternativa e conferma; responsabilità in IP-02/Q-09.
Picchi e continuità F02 §7	QS-03/QS-05; funzioni disponibili del percorso MVP e futura scheda.	Carico e ripristino con profilo dichiarato; soglie proposte, non esiti osservati.
Catalogo configurabile F02 §5.2	US-D03; QS-06; catalogo iniziale del prototipo.	Prova senza sviluppatore quando esiste la gestione catalogo; fuori dal primo taglio MVP.
CR-05 e scheda distinta F02/F07	US-D13–US-D14; MIG-05; TOBE-02; QS-02/QS-03.	Prove su dati sintetici e categorie sovrapposte; perimetro in Q-06/Q-11.

Registro dei diagrammi

ID	Contenuto	Stato e aggiornamento
CTX-01	Confine del sistema e stakeholder.	Prodotto e aggiornato: v0.3 del 25/10/2026; A2, S1-01 (#2), #27. Sorgente drawio ed esportazione PNG in docs/requirements/diagrams/. Revisione del gruppo da registrare.
ASIS-01	Processo attuale e criticità.	ASIS-01A/B prodotti in Mermaid v0.1 del 25/10/2026 e incorporati in A3; sorgenti .mmd, SVG e PNG in docs/requirements/diagrams/. Ricostruzione da fonti, revisione del gruppo da registrare.
TOBE-01	Processo proposto e benefici.	TOBE-01A/B prodotti in Mermaid v0.1 del 25/10/2026; richiesta/disponibilità e appuntamento/chiusura. IP-01/IP-02 da validare in #29 e Q-09; A3 e A7.
TOBE-02	Rendicontazione trimestrale distinta dalle richieste.	Prodotto in Mermaid v0.1 del 25/10/2026 con PNG/SVG; A3. Perimetro operatori in Q-11; revisione del gruppo da registrare.
ID da assegnare	Modello concettuale, se utile; viste dei moduli e delle dipendenze; sequenze dei flussi scelti.	Da introdurre quando pertinente; allineare US, ADR, pattern e codice.

Metadati dei diagrammi: versione, data, sorgente modificabile (drawio per CTX-01; Mermaid per ASIS-01 e TOBE-01/02), esportazione e revisori effettivi. Le note separano fonti, ipotesi e proposte da validare.

Controllo di coerenza prima della review

Verificare che gli assistiti non diventino utenti o record identificativi; la scheda trimestrale resti distinta dalle richieste; il catalogo sia configurabile; ruoli e responsabilità coincidano tra processi, storie e qualità. Separare gli stati di dominio dagli stati di lavoro GitHub.

Controllare che ogni proposta indichi beneficio, ipotesi e verifica; ogni decisione tecnica sia attribuita al team; ogni risultato abbia evidenze reali. Aggiornare l'intero sommario di Word e verificare paginazione, tabelle e collegamenti dopo cambiamenti sostanziali.

D2 Fonti e riferimenti

ID	Documento e uso
F01	00-Presentazione Progetto Picus.pdf, cartella Progetto di Esame. Slide 3–11: processo, calendario e review; 18–29: attività, deliverable e preparazione.
F02	01-PICUS_richieste_informali_del_committente (1).pdf, cartella Progetto di Esame. §§1–3: natura e contesto; §4: as-is; §5: desiderata; §§6–9: dati, qualità e proposte; appendici A–B: catalogo e scheda trimestrale.
F03	Riferimento storico: AGENTS.md del workspace padre, non presente al 25/10/2026. Le scelte del team in A8 sono da riesaminare; non è una fonte del committente.
F04	Riferimento storico: docs/architecture.md, eliminato il 24/10 nell'allineamento al template. Sede attuale docs/architecture/; sviluppo in S2. Per calendario e review usare F01.
F05	Scrum Guide e chiarimenti ufficiali Scrum.org elencati sotto: responsabilità, eventi, DoD e pratiche facoltative.
F06	BA.docx, appunti dei confronti del 20 e 22/10/2026; copia BA.pdf allegata a #27. Contesto aggiornato, ruoli, CSV opzionale, ricezione e confini. Il dato 230.000 è da chiarire; le idee del team restano proposte. Fonte online
F07	Domande_risposta.pdf, allegato a #27, consultato il 25/10/2026; data del confronto non indicata. Sezioni Operatori, Scheda trimestrale e Flusso: accessi, categorie sovrapponibili, stati e responsabilità. Fonte online
F08	Fotografia delle issue usata per la v0.4 del 25/10: cinque Epic e Story #24–#28. Gli ID US-Dxx sono della proposta documentale e vanno abbinati alle issue aggiornate. Artefatti del team, non conferme del committente. Repository e issue
F09	Domande GitHub #21 e #29, consultate il 25/10/2026 per la v0.5: aperte e senza commenti alla lettura. Riguardano broadcast e confine del ciclo di vita. Sono domande del team, non risposte o decisioni del committente. #21 #29

Riferimenti Scrum

Scrum Guide ufficiale

Definition of Done

Sprint Review

Sprint Retrospective

Differenza tra Definition of Done e Definition of Ready

Aggiornamento delle fonti

Quando il committente o la docente forniscono chiarimenti successivi, registrare documento o confronto, data e punti modificati. Mantenere riconoscibili i desiderata iniziali, le riformulazioni concordate e le scelte tecniche del team; aggiornare gli artefatti coinvolti e la tracciabilità.

Le fonti informali non costituiscono una specifica completa o definitiva. Le proposte funzionali richiedono discussione; le scelte architetturali e sui pattern restano responsabilità del gruppo. [F02, §§1 e 9; F03]
